



Vanjska (*mid term*) evaluacija
provedbe lokalne razvojne
strategije LAG-a **Krka** u
razdoblju 2017. – 2020. godine

0



Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj, Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG Krka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj

Popis korištenih kratica	2
1. Uvod	3
2. Osnovne info o LRS.....	5
2.1. Izmjene LRS	8
3. Dosadašnja provedba LRS.....	11
3.1. Objava LAG natječaja.....	11
3.1.1. Struktura korisnika	14
3.1.2. Rezultati ulaganja kroz LAG natječaje.....	15
3.2. Provedba podmjere 19.3.....	16
3.3. Provedba podmjere 19.4.....	17
3.3.1. Aktivnosti informiranja i jačanja kapaciteta	18
4. Vrednovanje provedbe putem pokazatelja LRS.....	22
6. Provedbeni kapaciteti LAG-a Krka	23
6.1. Ured LAG-a Krka	23
6.2. Upravni odbor LAG-a Krka	24
6.3. Skupština LAG-a Krka.....	26
6.4. Nadzorni odbor LAG-a Krka	26
7. Vanjsko okruženje	27
8. Analiza rizika i provedenih aktivnosti za ublažavanje	28
9. Dodana vrijednost provedbe LRS LAG-a Krka	30
10. Opća ocjena provedbe LRS i djelovanja LAG-A Krka	33
11. Zaključci s preporukama	37
Popis slika i tablica.....	39
PRILOG 1 Pregled odabranih i odobrenih projekata na 31.12.2020. godine.....	40

Popis korištenih kratica

LAG – Lokalna akcijska grupa

LRS – Lokalna razvojna strategija

TO – Tip operacije

LEADER – fra. Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veze među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva

CLLD – eng. Community Led Local Development - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice

PRR – Program ruralnog razvoj

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

SC – Strateški cilj

PM – Prioritetna mjera

OPG – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

MP – Ministarstvo poljoprivrede

LHM – Leader mreža Hrvatske

UO – Upravni odbor

1. Uvod

Lokalna akcijska grupa (LAG) Krka predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora. Osnovana je 27. studenog 2011. godine kao neprofitna udruga. Područje LAG-a Krka smješteno je u centralnom djelu Šibensko-kninske županije, a pruža se od zaleđa i ruralnog predjela grada Šibenika, preko donjeg i srednjeg toka rijeke Krke te pritoke Čikole, do drniškoga kraja i okolnog područja. Administrativno pripada Šibensko-kninskoj županiji, ujedno i NUTS II regiji Jadranska Hrvatska, a zauzima površinu od ukupno 1.294,28 km², što predstavlja 43,23 % kopnene površine pripadajuće županije te 2,28 % kopnenog prostora Republike Hrvatske. Područje LAG-a obuhvaća ukupno sedam administrativnih jedinica lokalne samouprave: Gradove Drniš, Skradin, 20 naselja Grada Šibenika (Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate, Lozovac, Boraja, Danilo, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje polje, Lepenica, Perković, Mravnica, Slivno, Podine, Sitno Donje, Vrpolje i Vrsno) te općine Bilice, Promina, Ružić i Unešić.

Sukladno Statutu Udruge, osnovni ciljevi formiranja Udruge su jačanje kapaciteta lokalnih dionika te širenje LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja Udruge, uz međusektorsko povezivanje, jačanje kapaciteta, razmjenu iskustva i javno zagovaranje interesa lokalnih razvojnih dionika, predstavnika javnih i privatnih socio-ekonomskih interesa, donošenje i provođenje lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz sudjelovanje u LEADER programu te unapređenja kvalitete života kroz održivi, integrirani lokalni razvoj u ruralnom području JLS-ova koje su članice Udruge. Specifični ciljevi LAG-a Krka, ujedno navedeni u LRS su:

- Razvoj i promicanje konkurentne poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje
- Unapređenje održivosti i raznovrsnosti gospodarskih djelatnosti
- Unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja.

Predmet ove evaluacije je ocjena provedbe Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) LAG-a Krka 2014.-2020., tj. provedba podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u među-evaluacijskom razdoblju, tj. od 2017. do kraja 2020. godine, s obzirom da LRS LAG-a Krka navodi provedbu dvaju vanjskih vrednovanja, jednog u među-evaluacijskom razdoblju, tzv. *mid-term* vrednovanje i jedno nakon završetka provedbe, tzv. *ex post* vrednovanje. Ovo vrednovanje provedeno je od strane vanjskog stručnjaka, prema uspostavljenoj metodologiji za evaluaciju provedbe LRS, mjerenje učinka provedbe LRS te rada LAG-ova. Evaluacija se sastoji od evaluacije provedbe LRS LAG-a Krka te internih akata LAG-a, koji omogućuju postupanje i realizaciju

planiranih mjera kojima je svrha dostizanje ciljeva usvojenih u LRS. Također evaluacija uključuje horizontalnu evaluaciju koja obuhvaća tijela donošenja odluka: Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor, operativna tijela za provedbu LRS: stručnu službu, LAG administratore, volontere te praćenje, odnosno analizu dosadašnjih godišnjih izvješća o radu, koja se usvajaju na Skupštini te dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede. U procesu praćenja i procjene vodit će se briga o osnovnim evaluacijskim kriterijima:

- Relevantnost (odabir prioriteta, odabir korisnika, metodologija),
- Djelotvornost (ostvarene koristi, ciljevi, upravljački kapacitet LAG-a, uključenost ključnih dionika),
- Učinkovitost (ostvareni kvantitativni i kvalitativni pokazatelji učinka, rezultata i izlaza),
- Ostvarena promjena (ostvareni ciljevi),
- Održivost (korisnika/projekata, LAG-a, programa)
- Koherentnost (dosljednost u odnosu na relevantne politike, strategije i programe),
- Dodana vrijednost u zajednici (postizanje horizontalnih ciljeva).

Polazište i temelji za provedbu postupka evaluacije LRS LAG-a Krka u razdoblju 2017. – 2020. godine predstavljaju svi relevantni dokumenti, izvješća, odluke i propisi povezani s uspostavom, funkcioniranjem i radom udruge te oni nastali u procesima dosadašnjeg raspisivanja LAG natječaja te odabira projekata na LAG razini:

- LRS LAG-a Krka 2014-2020,
- Statut LAG-a Krka,
- Pravilnik o procjeni i odabiru projekata na natječajima prijavljenih na natječajima u sklopu provedbe LRS LG-a Krka iz mjere 19.2 PRR-a RH
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave LAG-a Krka
- Izvješćaji o radu LAG-a Krka za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu
- Godišnji Izvješćaji o provedbi LRS 2014 - 2020 LAG-a Krka koji se dostavljaju MP.

Evaluacija je provedena tijekom travnja 2021. godine, a svi relevantni podaci odnose se zaključno na dan 31.12.2020. godine. Za prikupljanje potrebnih podataka i informacija od strane LAG-a Krka, korišteni su pripremljeni tablični obrasci te online upitnici, na koje je osoblje LAG-a kontinuirano dostavljalo potrebne odgovore i informacije tijekom izrade evaluacije.

2. Osnovne info o LRS

Lokalna razvojna strategija LAG-a Krka 2014 – 2020 izrađena je tijekom 2015. i 2016. godine, a usvojena je od Skupštine 21.3.2016. godine. Njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz podmjere 19.1 „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Izrada strategije temeljena je na osnovnim načelima LEADER/CLLD pristupa, a izrađena je konzultacijskim procesom vanjskog stručnjaka i članova formirane radne skupine za izradu strategije u kojoj su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora i to dionici s čitavog područja LAG-a, članova Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora LAG-a. U izradi LRS-a sudjelovalo je ukupno 60 lokalnih dionika, koji su uz stručno vođenje, sami kreirali i izrađivali glavne dijelove LRS i sudjelovali u interaktivnim radionicama. Na njima se raspravljalo o ključnim problemima i radilo na izradi SWOT analize područja tako da su oni postali aktivni partneri u izradi LRS i u pokretanju razvoja lokalnog područja. Osim radionica, u informativnoj fazi izrade provedeno je i anketiranje ključnih dionika koji su pružili kvalitetne povratne informacije o temeljnim razvojnim potrebama i potencijalima područja. U procesu izrade LRS organiziran je niz radionica, okruglih stolova i panel rasprava otvorenih za javnost, izrađena je baza projektnih ideja, a javnost je putem medijskih objava upoznata s procesom i glavnim koracima u izradi LRS.

5

LRS LAG-a Krka 2014-2020 je u trenutku izrade inicijalno programirana na ukupne rashode za provedbu tipova operacija te postizanje prioritetnih mjera i strateških ciljeva na iznos od 803.250,00 EUR, od čega je 612.000,00 EUR-a alocirano za provedbu podmjere 19.2, 30.600 EUR je alocirano za podmjeru 19.3, dok je 160.650 EUR-a alocirano za provedbu podmjere 19.4, sukladno simulaciji Upravljačkog tijela Ministarstva poljoprivrede. LRS je usvojena na Skupštini dana 21.03.2016. godine, a zahtjev za potporu je podnesen 23.6.2016. godine, nakon čega je Agencija donijela odluke o privremenoj dodjeli sredstava 9.1.2017. godine. Zbog viška raspoloživih sredstava Agencija je provela postupak uvećanja pa su sredstva dodijeljena u konačnoj odluci uvećana, u iznosu od ukupno 843.412,50 EUR-a, od čega 642.600,00 EUR-a za provedbu podmjere 19.2, 32.130,00 EUR-a za provedbu podmjere 19.3 te 168.682,50 EUR-a za provedbu podmjere 19.4, kako je iskazano u tablici u nastavku.

LAG Krka je u postupku odabira LAG-ova temeljem provedenog postupka rangiranja ostvario ukupno 36 bodova, pri čemu je za ocjenu kvalitete lokalne razvojne strategije ostvareno 20 bodova, za kriterij broja stanovnika unutar LAG-a 7 bodova, za kriterij broja jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a 5 bodova, te za kriterij udjela (%) civilnog i gospodarskog sektora u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a 4 bodova.

Tablica 1 Odobreni iznosi LRS LAG-a Krka prema podmjerama prema Ugovoru

Podmjera	Privremeno dodijeljena sredstva (HRK)	Konačno odobrena sredstva (HRK)	Privremeno dodijeljena sredstva (EUR)	Konačno odobrena sredstva prema (EUR)
19.2	4.580.697,60	4.809.732,48	612.000,00	642.600,00
19.3	229.034,88	240.486,62	30.600,00	32.130,00
19.4	1.202.433,12	1.262.554,78	160.650,00	168.682,50
UKUPNO LRS	6.012.165,60	6.312.773,88	803.250,00	843.412,50

Obveze LAG-a Krka u provedbi LRS i upravljanju dodijeljenim sredstvima regulirane su Ugovorom o dodijeli sredstava odabranom LAG-u (Ugovor LAG-a Krka i APPRRR-a br. 5731 s pripadajućim Aneksom br. 5731/1) te Sporazumom o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera.

Inicijalno izrađena LRS LAG-a Krka (V1) sastojala se od 3 strateška cilja: 1. Razvoj i promicanje konkurentne poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje, 2. Unapređenje održivosti i raznovrsnosti gospodarskih djelatnosti, te 3. Unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja. Za njihovo postizanje predviđeno je 7 prioriternih mjera i 18 tipova operacija. Potrebno je napomenuti kako su tipovi operacija u lokalnim razvojnim strategijama ekvivalentni onima iz Programa ruralnog razvoja RH, odnosno LAG-ovi nisu mogli samostalno kreirati sve potrebne stavke kod tipova operacija, uključujući prihvatljive aktivnosti, troškove i korisnike, te iznos potpore, dok su izuzetak kriteriji prihvatljivosti i intenzitet potpore¹, koje su LAG-ovi mogli samostalno odrediti, temeljem specifičnosti prostora LAG-a i vlastitih potreba.

Unatoč navedenom ograničenju u pogledu tipova operacija, definiranje prioriternih mjera i strateških ciljeva je provedeno adekvatno, što proizlazi iz konzistentnosti ovih triju razina, tj. provedbom odabranih tipova operacija jasno i ciljano se postižu prioriternje mjere, a njihovim ostvarivanjem, postižu se tri temeljno definirana strateška cilja. U tablici u nastavku iznesen je pregled definiranih strateških ciljeva te odabranih prioriternih mjera i tipova operacija u inicijalnoj izrađenoj strategiji.

¹ Sukladno čl. 13 st. 2 Pravilnika o provedbi podmjere 19 (NN 96/17) i čl. 37 st. 2 Pravilnika o provedbi mjera PRR-a RH (NN91/19), u LRS se za pojedini TO može navesti do 20 % viši intenzitet potpore, ali ne viši od najvišeg propisanog za pojedini TO u Prilogu II Uredbe (EU) br. 1305/13.

Tablica 2 Pregled odabranih strateških ciljeva, mjera i tipova operacija LRS LAG-a Krka – VO

Prioritetni tipovi operacija u programskom razdoblju 2014.- 2020.	Prioritetne Mjere (Aktivnosti) u programskom razdoblju 2014.- 2020.	Strateški razvojni ciljevi LAG-a u programskom razdoblju 2014.-2020.
1.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	1.1. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih gospodarstava	1. Razvoj i promicanje konkurentne poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje
1.1.2. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava		
1.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima	1.2. Razvoj, promocija i podrška plasmanu proizvoda i usluga poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje	
1.2.2. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe		
2.1.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području	2.1. Potpora novim i/ili inovativnim poduzetničkim idejama, organizacijama i udruženjima	2. Unapređenje održivosti i raznovrsnosti gospodarskih djelatnosti
2.1.2. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima		
2.1.3. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija		
2.2.1. Korištenje obnovljivih izvora energije	2.2. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske učinkovitosti u gospodarstvu i poduzetništvu	
2.2.2. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša		
3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu	3.1. Razvoj i unapređenje postojećih i novih javnih, kulturnih, društvenih, sportsko-rekreacijskih i drugih bitnih sadržaja namijenjenih lokalnom stanovništvu i posjetiteljima područja	3. Unapređenje kvalitete života svih stanovnika i posjetitelja područja
3.2.1. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a	3.2. Jačanje kapaciteta i animiranje svih dionika LAG-a Krka	
3.2.2. Tekući troškovi i animacija		

2.1. Izmjene LRS

U razdoblju od 2017. do 2020. godine provedeno je jedno usklađenje, zbog uvećanja financijske alokacije od strane Upravljačkog tijela te tri izmjene LRS LAG-a Krka, što je prikazano u tablici u nastavku.

Tablica 3 Provedene promjene LRS LAG-a Krka u razdoblju 2017.-2020.

R. B.	Datum donošenja odluke od strane nadležnog tijela LAG-a	Datum podnošenja zahtjeva za odobrenje promjene	Datum donošenja odluke o odobrenju promjene	Vrsta promjene
1. V1	21.11.2017.	1.12.2017.	4.1.2018.	Usklađenje
2. V2	9.7.2018.	2.8.2018.	13.9.2018.	1. Izmjena
3. V3	26.3.2019.	19.4.2019.	5.6.2019.	2. izmjena
4. V4	3.9.2020.	18.9.2020.	18.12.2020.	3. izmjena

Izmjene LRS LAG-a Krka su provedene zbog intervencija u inicijalno odabranim tipovima operacija, prije svega zbog nemogućnosti njihovog raspisivanja na LAG razini. Naime, aktivacija tipova operacija od strane Upravljačkog tijela, kao neophodan preduvjet za raspisivanje natječaja na LAG razini, nije se odvijala vremenski usklađeno s inicijalno određenim akcijskim planom provedbe. Pregled aktiviranih LAG natječaja te Natječaja za provedbu tipova operacija putem LRS od strane APPRRR-a kronološki je iznesen u poglavlju 7. Vanjsko okruženje, iz čega se može zaključiti o nužnosti provedenih izmjena LRS LAG-a Krka.

Drugi razlog provedenih izmjena LRS LAG-a Krka su promjene potreba krajnjih korisnika (nositelja projekata) u odnosu na inicijalno prikupljene projekte iz baze projektnih ideja prije i tijekom izrade LRS, tijekom provedbenog razdoblja. U inicijalno izrađenoj LRS nije bila planirana provedba tipa operacije ekvivalentna TO 6.3.1. PRR-a, koju je Upravljačko tijelo prvu aktiviralo, stoga je bilo potrebno provesti izmjenu LRS kako bi se uveo ovaj tip operacije. Tako je prvom izmjenom LRS (V2) alocirano 150.000 EUR-a za provedbu TO 1.1.1, ekvivalent TO 6.3.1 PRR-a. Zbog pojačanog interesa korisnika za ovim TO, alokacija je u idućim izmjenama LRS podignuta na 392.600 EUR-a, tj. 61,1 % alokacije za provedbu podmjere 19.2². Nadalje, alokacija je s inicijalno programiranih 115.000 EUR, povišena na 175.000 EUR-a, tj. 27,23% alokacije od podmjere 19.2, za provedbu TO 3.1.1, ekvivalent TO 7.4.1 PRR-a. Interes je korisnika varirao za TO 1.1.2, ekvivalent TO 6.1.1 PRR-a, pa trenutačna alokacija za ovaj TO iznosi 75.000 EUR-a. Za preostalih 8 inicijalno planiranih tipova operacije, interes potencijalnih korisnika je tijekom razdoblja provedbe LRS mijenjan, a uz činjenicu da za neke od njih nije bilo mogućnosti raspisivanja na LAG razinu, zbog neaktivacije od

² Potrebno je napomenuti da ukupna alokacija za TO 1.1.1 od 392.600 EUR-a, nije djeljiva sa fiksnim iznosom potpore od 15.000 EUR-a, već preostaje 2.600 EUR-a, koje prilikom treće izmjene LRS i Plana provedbe (podnesene 18.9.2020.), zbog tijeka akcijskog plana, nije bilo moguće alocirati na druge TO. Ovaj preostali iznos će prilikom nove izmjene biti potrebno alocirati na TO s tzv. kliznim iznosom potpore.

strane UT-a, alokacija im je postepeno smanjivana te su na poslijetku u aktualnoj važećoj LRS (V4) u potpunosti izostavljeni. U narednom periodu, sukladno odluci o dodjeli sredstava LAG-ovima za prijelazno razdoblje, planira se provesti izmjena LRS i Plana provedbe, vezano uz prijelazno razdoblje (2021. i 2022. godinu). U okviru izmjene sagledati će se mogućnosti i polazišta za povratkom određenih tipova operacija iz inicijalno odabrane LRS (V0), a sukladno provedenom iskazu interesa potencijalnih korisnika, kao i objektivnim mogućnostima raspisivanja LAG natječaja za pojedine TO.

Sukladno promjenama u alokacijama za tipove operacija, provedene su izmjene financijskih alokacija za pripadajuće prioritetne mjere i strateške ciljeve, dok su pojedine prioritetne mjere, kao i strateški cilj 2, u potpunosti izostavljeni. U nastavku je tablično prikazan pregled izmjena financijskih alokacija u apsolutnim i relativnim iznosima prema SC, PM i TO.

Tablica 4 Pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a Krka

Verzija LRS	Financijska alokacija – Strateški ciljevi					
	SC1		SC2		SC3	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
LRS – V0	243.000,00	29,17	465.000,00	55,82	125.000,00	15,01
LRS – V1	187.457,14	22,22	304.428,57	36,10	351.526,79	41,68
LRS – V2	270.000,00	32,01	197.600,00	23,43	375.812,50	44,56
LRS - V3	360.000,00	42,68	107.600,00	12,76	375.812,50	44,56
LRS – V4	467.600,00	55,44	-	-	375.812,50	44,56

9

Tablica 5 Pregled izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a Krka

Verzija LRS	Financijska alokacija - Mjere									
	LRS - V0		LRS – V1		LRS – V2		LRS – V3		LRS – V4	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
M1.1	113.000,00	13,56	148.885,72	17,65	270.000,00	42,01	360.000,00	56,02	467.600,00	72,77
M1.2	50.000,00	6	38.571,42	4,57	/	/	/	/	/	/
M1.3	80.000,00	9,60	/	/	/	/	/	/	/	/
M2.1	335.000,00	40,22	204.142,86	24,21	162.600,00	25,30	107.600,00	16,75	/	/
M2.2	130.000,00	15,61	100.285,71	11,89	35.000,00	5,46	/	/	/	/
M3.1	125.000,00	15,01	150.714,29	17,87	175.000,00	27,23	175.000,00	27,23	175.000,00	27,23
M3.2 ³	260.312,50	Np	200.812,74	Np	200.812,74	Np	200.812,74	Np	200.812,74	Np

³ Ukupni iznos sredstava za provedbu podmjera 19.3 i 19.4

Tablica 6 Pregled izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a Krka

Verzija LRS	Financijska alokacija – Tipovi operacija									
	LRS - V0		LRS – V1		LRS – V2		LRS – V3		LRS-V4	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
TO1.1.1	15.000	1,80	11.571,43	1,37	150.000,00	23,34	360.000,00	56,02	392.600,00	61,1
TO1.1.2	68.000,00	8,16	137.314,29	16,28	120.000,00	18,67	/	/	75.000,00	11,67
TO1.1.3	30.000,00	3,60								
TO1.2.1	30.000,00	3,60	23.142,85	2,74	/	/	/	/	/	/
TO1.2.2	10.000,00	1,20	15.428,57	1,83	/	/	/	/	/	/
TO1.2.3	10.000,00	1,20	/	/	/	/	/	/	/	/
TO1.3.1	50.000,00	6,00	/	/	/	/	/	/	/	/
TO1.3.2	30.000,00	3,60	/	/	/	/	/	/	/	/
TO2.1.1	150.000,00	18,01	100.000,00	11,86	162.600,00	25,30	107.600,00	16,75	/	/
TO2.1.2	130.000,00	15,61	104.142,86	12,35	/	/	/	/	/	/
TO2.1.3	5.000,00	0,60	/	/	/	/	/	/	/	/
TO2.1.4	50.000,00	6,00	/	/	/	/	/	/	/	/
TO2.2.1	125.000,00	15,01	96.428,57	11,43	35.000,00	5,46	/	/	/	/
TO2.2.2	5.000,00	0,60	3.857,14	0,46	/	/	/	/	/	/
TO3.1.1	115.000,00	13,81	150.714,29	17,87	175.000,00	27,23	175.000,00	27,23	175.000,00	27,23
TO3.1.2	10.000,00	1,20	/	/	/	/	/	/	/	/
TO3.2.1 ⁴	41.650,00	Np	32.130,00	Np	32.130,00	Np	32.130,00	Np	32.130,00	Np
TO3.2.2 ⁵	218.662,50	Np	168.682,50	Np	168.682,50	Np	168.682,50	Np	168.682,50	Np

⁴ Iznos sredstava za provedbu podmjere 19.3

⁵ Iznos sredstava za provedbu podmjere 19.4

3. Dosadašnja provedba LRS

3.1. Objava LAG natječaja

Sukladno svojoj temeljnoj ulozi provedbe lokalne razvojne strategije, LAG Krka je do 31. 12. 2020. godine raspisao ukupno 4 LAG natječaja, te su prema važećem akcijskom planu provedbe LRS iz verzije V4 raspisani svi predviđeni LAG natječaji⁶. Pri tome su raspisana 2 LAG natječaja za tip operacije 1.1.1 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", ekvivalentni tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja RH, te po jedan LAG natječaj za tip operacije 3.1.1 "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ekvivalentan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja RH uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu" i tip operacije 1.1.2 „Potpora mladim poljoprivrednicima“, ekvivalentan tipu operacije 6.1.1 Programa ruralnog razvoja RH.

Kronološki prvi LAG natječaj objavljen je za tip operacije 3.1.1, dana 29.10.2018. godine, ukupno raspoloživih sredstava od 1.309.840,00 HRK. Na natječaj je pristiglo 7 projektnih prijava i za svih 7, ukupne vrijednosti 1.273.425,00 HRK, nakon faze administrativne provjere i ocjenjivanja, LAG Krka donio je Odluke o odabiru. APPPR, također za svih 7 projekata iste vrijednosti, donosi Odluke o financiranju. Do 31.12.2020. godine, svih 7 projekata je u fazi provedbe.

Drugi po redu LAG natječaj raspisan je za tip operacije 1.1.1, dana 31.12.2018. godine, ukupno raspoloživih sredstava od 1.112.400,00 HRK. Dana 30.8.2019. godine natječaj je izmijenjen radi povećanja raspoloživih sredstava na 2.694.528,00 HRK. Na natječaj je pristiglo 25 projektnih prijava, a za njih 22, ukupne vrijednosti 2.447.280,00 HRK, LAG Krka donosi Odluke o odabiru. Nakon obrade od strane APPRRR-a, donesena je Odluka za 20 projekata ukupne vrijednosti 2.224.800,00 HRK. Za 2 prijavljena projekta APPRRR ne donosi Odluke o financiranju⁷. Do 31.12.2020. godine svi su projekti još u fazi provedbe. Za ovih 20 projekata isplaćeno je 50 % sredstava korisnicima na početku provedbe.

⁶ Potrebno je napomenuti da, sukladno komentaru iz reference br. 2, nisu raspisani LAG natječaji ukupne vrijednosti dodijeljenih sredstava za provedbu podmjere 19.2. Preostala će se razlika alocirati prilikom slijedeće izmjene LRS te će biti raspisana u nadolazećem/im LAG natječajima, sukladno iskazu interesa potencijalnih korisnika.

⁷ Jedan korisnik je odustao od zahtjeva za potporu nakon što je projekt ušao u obradu od strane APPRRR-a, a drugi je odbijen od strane APPRRR-a, jer je prilikom donošenja Odluke o odabiru za tu projektnu prijavu bilo je više od 49 % glasova iz javnog sektora.

Dana 28.9.2020. godine, raspisan je treći po redu, a ukupno drugi LAG natječaj za tip operacije 1.1.1., ukupno raspoloživih sredstava od 677.475,00 HRK. Na natječaj je pristiglo 30 projektnih prijava, a do 31.12.2020. godine, LAG službeno nije donio odluke o odabiru za ove projekte.

Četvrti LAG natječaj raspisan je za tip operacije 1.1.2, dana 28.12.2020. godine. Ukupno raspoloživa sredstva na natječaju su iznosila 518.875,00 HRK, a pristigle su 2 projektne prijave. Do provedbe ove evaluacije, projekti su u fazu administrativne provjere i ocjenjivanja na razini LAG-a te se očekuje donošenje Odluka o odabiru UO-a LAG-a Krka u narednom razdoblju.

Tablica 7 Pregled objavljenih LAG natječaja iz LRS LAG-a Krka u razdoblju 2017.-2020.


R.B.	LAG natječaj	TO LRS	Datum raspisivanja	Inicijalno raspoloživa sredstva	Datum izmjene	Konačna raspoloživa sredstva	Broj prijava	Broj odabranih projekata LAG razina	Odobrena financijska sredstva LAG	Odobrena financijska sredstva APPRRR
1.	"Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu"	TO 3.1.1.	29.10.2018.	1.309.840,00	Np	Np	7	7	1.273.425,00	1.273.425,00
2.	"Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"	TO 1.1.1.	31.12.2018.	1.112.400,00	30.8.2019.	2.694.528,00	25	22	2.447.280,00	2.224.800,00
3.	"Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"	TO 1.1.1.	28.9.2020.	677.475,00	9.10.2020.	Np	30	Np	Np	Np
4.	„Potpora mladim poljoprivrednicima“	TO 1.1.2.	28.12.2020.	518.875,00	Np	Np	2	Np	Np	Np

3.2. Projekti odobreni na LAG natječajima

Do 31.12.2020. godine, odluku o odabiru od strane UO-a LAG-a Krka dobilo je ukupno 29 projekata, dok je za njih 27 donesena odluka o financiranju od strane APPRRR-a. Radi se o 7 projekata iz LAG natječaja za TO 3.1.1 i 20 projekata iz LAG natječaja za TO 1.1.1. Svi projekti odabrani za financiranje su u fazi provedbe, dok je za 20 projekata iz LAG natječaja za TO 1.1.1 korisnicima avansno isplaćeno 50 % dodijeljenih sredstava. Sukladno broju pristiglih prijava, do sada najveći interes potencijalnih korisnika je iskazan za TO 6.3.1 PRR-a.


3.3. Struktura odobrenih korisnika

Distribucija korisnika do sada odobrenih projekata na LAG Krka natječajima prema interesnim sektorima pokazuje kako se najveći udio od 76 % odobrenih sredstava (2.224.800,00 HRK) odnosi na gospodarski sektor, i to poljoprivredu. Idući je prema udjelu od 24 % odobrenih sredstava (1.273.425,00 HRK) javni sektor, dok se na civilni sektor nije bilo korisnika. Ovakva je distribucija bila očekivana s obzirom na dominantnu prihvatljivost prijavitelja u LAG natječajima koji se odnose na različite organizacijske oblike registrirane za poljoprivrednu djelatnost – obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačke organizacije, poljoprivredne zadruge, obrte registrirane za poljoprivrednu djelatnost, trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (za TO 1.1.1 i TO 1.1.2) te organizacijske oblike javnog sektora – jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-ova, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, te civilnog sektora – udruge, zajednice udruga, zaklade, fundacije, vjerske zajednice (za TO 3.1.1).

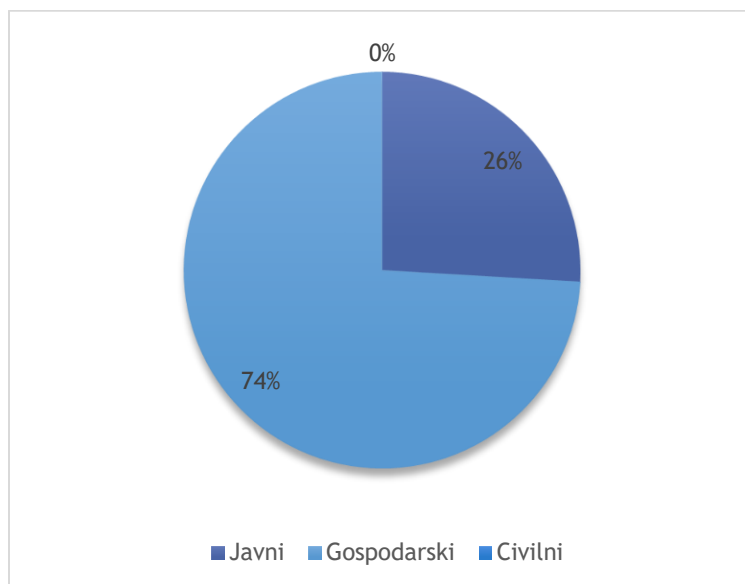

Slika 1 Vrijednost odobrenih projekata prema interesnim sektorima

Distribucija korisnika do sada odobrenih projekata na LAG Krka natječajima prema sjedištu korisnika pokazuje kako se najveći kumulativni iznos od 963.992,50 HRK odnosi na korisnike Grada Drniša, zatim 630.272,00 HRK na korisnike iz Grada Skradina, te 519.032,50 HRK na korisnike iz Grada Šibenika. Slijede potom korisnici iz Općine Promina s kumulativnim iznosom odobrenih sredstava od 407.792,50 HRK, iz Općine Unešić 407.792,50 HRK, Općine Ružić 296.552,50 HRK te Općine Bilice 272.790,00 HRK. Primjetno je da su korisnici projekata iz svih JLS-ova u sastavu LAG-a zastupljen među odobrenima na LAG natječajima.

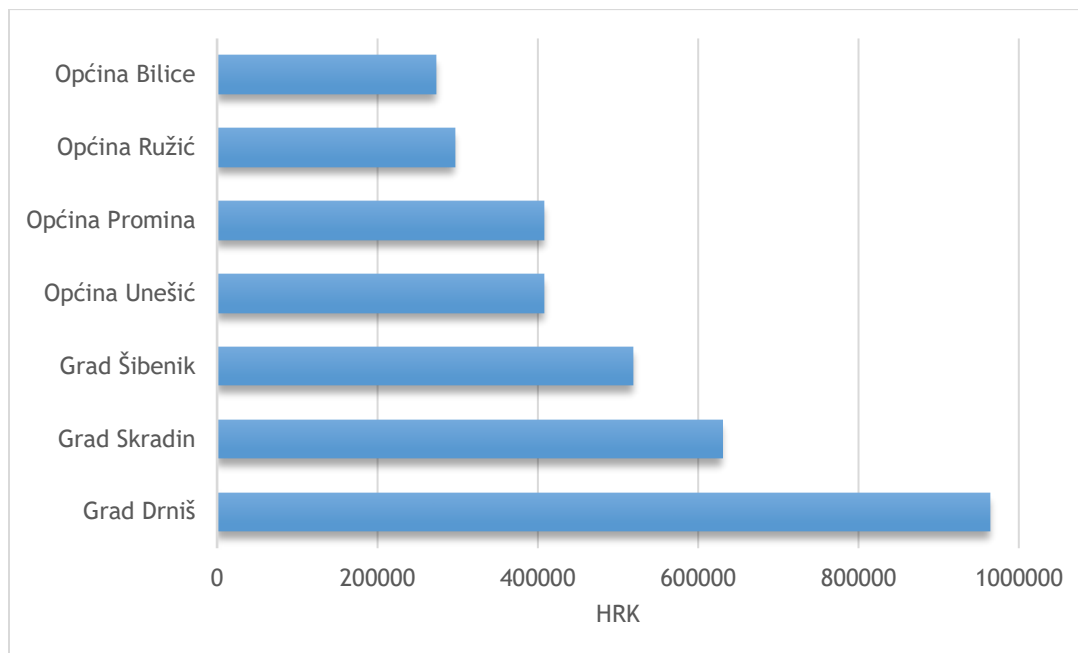

Slika 2 Vrijednost odobrenih projekata prema sjedištu korisnika

3.4. Rezultati ulaganja kroz odobrene projekte

Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, vidi se da će korisnici gospodarskog sektora iz raspisanih LAG natječaja za TO 1.1.1 LRS, uglavnom provesti modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja kupnjom nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i uređenjem poljoprivrednih površina, te povećati ukupni standardni ekonomski rezultat svojih poljoprivrednih gospodarstava, nabavom različitih biljnih sadnica, životinja, kupnjom i uređenjem zemljišta i sl.

Prema opisima ulaganja odabranih projekata iz raspisanih LAG natječaja za TO 1.1.1 LRS, okvirno će se realizirati:

- nabava i sadnja više od 150 sadnica maslina,

- nabava i sadnja 500 sadnica smilja,
- nabava 400 višegodišnjih sadnica aromatičnog i medonosnog bilja,
- nabava 70 sadnica marelice,
- kupnja 277 domaćih životinja (kokoši, koze, ovce, junice, krave i svinje),
- kupnja 50 LR košnica,
- modernizacija rada 20 OPG-ova nabavom nove opreme i pomagala,
- priprema 4 zemljišta za sadnju,
- uređenje i adaptacija 3 prostora za potrebe poslovanja,
- 13 korisnika konzultantskih usluga i usluga izrade poslovnog plana,

Pregledom odabranih projekata iz Priloga 1, a sukladno prihvatljivim aktivnostima (ulaganjima) definiranim natječajem, moguće je vidjeti da će korisnici javnog sektora ulagati u rekonstrukcije i opremanje 3 društveno-kulturna doma. Za unapređenje i poticanje djece na aktivniji i kvalitetniji život, 1 dječji park biti će opremljen fitness spravama dok je drugi u procesu izgradnje. U tijeku je rekonstrukcija zelenih površina u općini Promina i izgradnja sustava za navodnjavanje nogometnog igrališta NK DOŠK Drniš.

3.2. Provedba podmjere 19.3

Podmjera 19.3 provodi se kroz dva tipa operacija: TO 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i TO 19.3.2 „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Iako je Odlukom o odabiru LAG-u Krka alocirano 32.130,00 EUR-a za provedbu podmjere 19.3, za odobrenje konkretnog projekta i troškova projekata, LAG-ovi su dužni podnijeti APPRRR-u Zahtjev za potporu temeljem Natječaja za provedbu pojedinog tipa operacije.

U LRS LAG-a Krka definirano je nekoliko tematskih područja projekata suradnje:

- razvoj horizontalne i vertikalne suradnje na području LAG-a u kojima će sudjelovati proizvođači pršuta, sira, meda, vina, maslinovog ulja i drugih proizvoda od interesa;
- promocija poljoprivrednih proizvoda i tradicijskih zanata, razmjenu iskustava kao i poticanje na udruživanja u poljoprivredi;
- razmjena iskustava u zaštiti, očuvanju, promociji i valorizaciji biološke raznolikosti, vodnih, ali i svih drugih prirodnih bogatstava na njihovom području;
- proizvodnja pršuta (npr. Istra u Hrvatskoj) i sira u svrhu organiziranja različitih vrsta aktivnosti, festivala, sajмова i/ili drugih sličnih manifestacija na kojima bi se povezivali proizvođači radi unapređenja i razmjene znanja, ali i radi promoviranja proizvoda široj zajednici;

- ekološka poljoprivredna proizvodnja s ciljem poticanje suradnje radi unapređenja i razvoja održive ekološke poljoprivrede posebice na području NP Krka i rubnim područjima, ali i općenito, s obzirom na značaj i trend razvoja eko-poljoprivrede;

Do sada LAG Krka nije prijavio, niti proveo projekte suradnje. Ovaj zadatak predstoji u narednom razdoblju.

3.3. Provedba podmjere 19.4

Provedba podmjere 19.4, osim nacionalnim pravilnicima, regulirana je Natječajem za provedbu podmjere 19.4 „Tekući troškovi i animacija“, provedba tipa operacija 19.4.1 „Tekući troškovi i animacija“. Nastali troškovi refundiraju se kvartalno putem zahtjeva za isplatu.

Troškovi koji su se do sada potraživali kroz podmjeru 19.4 odnosili su se na stavke: 19.4.1.1. „Plaće (temeljem ugovora o radu) zaposlenika LAG-a te troškove vezane uz naknade prijevoza na posao i s posla za zaposlenike LAG-a, 19.4.1.2. Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS; Sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima (uključujući tekuće sastanke u vezi rada LAG-a i LAG Natječaja) seminarima, treninzima, studijskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi provedbe LRS i/ili Programa, na ili izvan područja LAG, 19.4.1.3. Putni troškovi (troškovi navedeni u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a) u vezi događaja iz točke 19.4.1.2.; 19.4.1.4. Troškovi ureda i 19.4.1.5. Usluge vezani uz rad LAG-a. Nadalje, potraživani troškovi za 19.4.2. Animacija su slijedeći: 19.4.2.2. Promidžbene aktivnosti i 19.4.2.3. Usluge.

U tablici u nastavku je prikazan iznos isplaćenih sredstava LAG-a Krka po kvartalima prema podnesenim zahtjevima za isplatu.

Tablica 8 Iznos isplaćenih sredstava LAG-a Krka po kvartalima

Datum podnošenja zahtjeva za isplatu	Datum donošenja odluke o isplati	Iznos isplate	Iznos za troškove zaposlenika	Ostali prihvatljivi troškovi	Neizravni troškovi temeljem fiksne stope	Iznos preostao za korištenje
30.3.2017.	13.6.2017.	22.568,64	14.654,12	Nije prikazano	Nije prikazano	1.239.986,14
30.6.2017.	21.9.2017.	42.356,49	Nije prikazano	Nije prikazano	Nije prikazano	1.197.629,65
25.9.2017.	15.11.2017.	62.570,73	48.713,97	Nije prikazano	Nije prikazano	1.135.058,92
27.12.2017.	27.3.2017.	63.501,01	47.850,24	Nije prikazano	Nije prikazano	1.071.557,91
29.3.2018.	18.5.2018.	58.426,67	47.850,24	Nije prikazano	Nije prikazano	1.013.131,24
29.6.2018.	30.8.2018.	72.452,97	49.038,24	16.058,99	7.355,74	940.678,27
20.9.2018.	12.10.2018.	95.373,46	49.194,56	38.799,72	7.379,18	845.304,81
12.12.2018.	28.2.2019.	74.514,48	49.249,10	17.878,01	7.387,37	770.790,33
29.3.2019.	27.5.2019.	75.110,91	53.254,42	713.868,33	7.988,16	695.679,42

21.6.2019.	16.7.2019.	65.750,86	47.754,10	10.833,64	7.163,12	629.928,56
26.9.2019.	8.11.2019.	89.124,61	67.607,63	11.375,84	10.141,14	540.803,95
30.12.2019.	25.3.2020.	87.263,79	63.213,78	14.567,94	9.482,07	453.540,16
20.3.2020.	27.4.2020.	104.969,99	66.481,94	28.515,76	9.972,29	348.570,17
29.6.2020.	7.9.2020.	92.204,23	72.742,81	8.550,00	10.911,42	256.365,94
18.9.2020.	23.10.2020.	102.137,35	73.888,41	17.165,68	11.083,26	154.228,59
21.12.2020.	9.3.2021.	94.586,46	74.270,84	9.175,00	11.140,62	59.642,13

3.3.1. Aktivnosti informiranja i jačanja kapaciteta

U sklopu podmjere 19.4, s ciljem postizanja adekvatne informiranosti i upućenosti potencijalnih nositelja projektnih prijava i korisnika, LAG Krka je redovito organizirao informativne radionice za potencijalne korisnike u sklopu objavljenih LAG Natječaja. Pri tome se vodilo računa o ravnomjernoj prostornoj uključenosti, pa su u sklopu svakog natječaja provedene informativne radionice u svakoj od JLS LAG-a Krka. Uslijed aktualnih prilika uzrokovanih pandemijom COVID 19, pojedine su informativne aktivnosti provedene u *online* formatu. Popis provedenih informativnih radionica s naznačenim brojem sudionika te lokacijom i datumom održavanja je iskazan u tablici u nastavku.

Tablica 9 Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 – Aktivnosti za potencijalne korisnike mjera definiranih LRS LAG-a Krka 2014. – 2020.

R.B.	Naziv aktivnosti	Broj sudionika	Lokacija održavanja	Datum provedbe
1.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	5	gradska uprave Drniš, Kralja Tomislava 1	5.11.2018.
2.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	3	Općina Ružić, Gradac, Put kroz Gradac 25	6.11.2018.
3.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	6	Općina Unešić, Trg Dr. Franje Tuđmana br. 40	7.11.2018.
4.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	3	Općina Promina, Oklaj, Put kroz Oklaj 14	8.11.2018.
5.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	3	gradska uprave Skradin, Trg Male Gospe 3	12.11.2018.
6.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 3.1.1. (1.LAG Natječaj)	4	Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika, Petra Grubišića 1	13.11.2018

7.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 1.1.1. (2.LAG Natječaj)		multimedijalna dvorana, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik, Poljana 6	16.1.2019.
8.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 1.1.1.(2.LAG Natječaj)		prostorije NP Krka, ispostava Drniš	17.1.2019.
9.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 1.1.1. (3. LAG Natječaj)		Velika gradska vijećnica, Drniš	30. 9. 2020.
10.	Radionica za potrebe informiranja i pripreme potencijalnih prijavitelja na TO 1.1.2. (4. LAG Natječaj)	N/P	N/P ⁸	28.12.2020.

U cilju jačanja kapaciteta LAG-a Krka za provedbu LRS i implementaciju LEADER/CLLD pristupa, zaposlenici i članovi LAG-a sudjelovali su u aktivnostima u organizaciji LEADER mreže Hrvatske (LMH) čiji je LAG Krka član, Ministarstva poljoprivrede, APPRRR-a i drugih LAG-ova, odnosno pravnih osoba koje se bave implementacijom pristupa razvoja vođenog zajednicom. Tematike održanih radionica i konferencija relevantne su za provedbu Mjere 19 i ruralni razvoj. Sudjelovanjem stručne službe LAG-a Krka na ovim događanjima pridonijelo se jačanju kapaciteta zaposlenika LAG-a te uspješnosti dosadašnje provedbe LRS i rada LAG-a.

Tablica 10 Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 – Sudjelovanje članova, zaposlenika i volontera LAG-a Krka na radionicama, sastancima i konferencijama vezanim uz provedbu mjere 19 i LEADER/CLLD pristupa i provedbe LRS u organizaciji drugih pravnih osoba

R. B.	Naziv aktivnosti	Tip aktivnosti	Organizator	Datum provedbe
1.	2. Hrvatski ruralni parlament		Hrvatska mreža za ruralni razvoj i LAG Međimurski doli i bregi	20.-22.4.2017.
2.	„Europa za građane“	Interaktivna radionica	Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske	10.5.2017.
3.	Priprema za implementaciju metodologije provedbe LEADER/CLLD podmjera 19.2. i 19.3. u okviru provedbe Mjere 19, Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.	radionica	LEADER Mreža Hrvatske, APPRRR, LAG Frankopan	28.-30.6.2017.
4.	2. ruralni kamp za mlade, Crna Gora	radionica	Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG, SWG RRRD Skopje.	24-27.7.2017.

⁸ S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID 19 umjesto animacijske radionice, a s ciljem informiranja potencijalnih korisnika LAG nije bio u mogućnosti održati radionicu, već sukladno uputama od strane APPRRR-a pripremljena je i na web stranici objavljena prezentacija vezana za 4. LAG Natječaj

5.	Izmjene LRS, Plan provedbe i priprema usklađenja i metodologije provedbe decentraliziranog odlučivanja o dodjeli javnih sredstava temeljem odredbi nadređenih uredbi EU te novog pravilnika za provedbu mjere 19, podmjera 19.2-19.4. – postupci i metode“	radionica	LEADER Mreža Hrvatske, APPRRR, LAG Zeleni bregi	31.8.- 2.9.2017.
6.	Provedba Mjere 5 PRR RH 2014.-2020.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, APPRRR, Šibensko-kninska županija	7.9.2017.
7.	Radni susret LAG-ova u svrhu pripreme za provedbu Lokalne razvojne strategije	radionica	LAG Lika	27.-28.9.2017.
8.	Provedba Podmjere 5.2. – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz PRR RH 2014.-2020.	radionica	APPRRR	4.10.2017.
9.	Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 PRR RH 2014.-2020.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, Mreža za ruralni razvoj, APPRRR	9.-10.11.2017.
10.	LRS LAG TO 6.3.1.	radionica	APPRRR	24.1.2018.
11.	Mjera 6, TO 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“	radionica	Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR	6.3.2018.
12.	Manifestacija „Naše domaće, sada i ubuduće“	manifestacija	Ministarstvo poljoprivrede	16.3.2018.
13.	Sustav provedbe financijskih instrumenata programa ruralnog razvoja RH 2014.-2015.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, HGK, HAMAG-BICRO, HBOR, APPRRR	25.5.2018.
14.	Natječaj za TO 19.3.1., 19.3.2., i 19.4.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, Mreža za ruralni razvoj i LAG More 249	13.6.2018.
15.	Razmjena iskustva u provedbi natječaja LAG-ova	radionica	Hrvatska mreža za ruralni razvoj	17.-18.7.2018.
16.	Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a unutar Mjere 19, PRR RH 2014.-2020.	sastanak	LAG Cetinska Krajina	19.9.2018.
17.	Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja – analiza provedbe Mjere 19 unutar PRR RH-a	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, Mreža za ruralni razvoj, LEADER Mreža Hrvatske, LAG Marinianis	3.-5.10.2018.
18.	Integrirani lokalni razvoj provedbom LEADER/CLLD-a, uvod u vrednovanje LAG-ova/LRS i jačanje međunarodne suradnje LAG-ova	radionica	LEADER Mreža Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Društvo za razvoj slovenskog podeželja i LAG Sava	13.- 16.11.2018.
19.	VIA DINARICA – Pustolovni koridor za održivi razvoj	radionica	Udruga Via Dinarica	25.1.2019.

20.	Provedba LRS u Mjeri 19	sastanak	Ministarstvo poljoprivrede/Odjel za LEADER i ruralnu mrežu	20.3.2019.
21.	3. Hrvatski ruralni parlament		Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska mreža za ruralni razvoj, LAG More 249	20.-23.5.2019.
22.	2. Konferencija SBS LAG-ova: „Turizam kroz nepregledna zlatna polja, opjevane vinograde o slavonsku idilu“	konferencija	LAG Karašica	17.-18.9.2019.
23.	Stanje provedbe M19, CLLD 2012.-2027., Godišnje izvješće o radu LAG-ova za 2019., Natječaj za TO 19.3.1. i TO 19.3.2.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, APPRRR	27.11.2019.
24.	Predstavljanje Nacrta strategije Hrvatske poljoprivrede i akvakulture nakon 2020.		Ministarstvo poljoprivrede	20.6.2020.
25.	Stanje provedbe M19 i prijelazno razdoblje 2021.	radionica	Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalna ruralna mreža, APPRRR	13.7.2020.
26.	LEADER/CLLD – alat integriranog lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom – metode i mogućnosti provedbe	radionica	LEADER Mreža Hrvatske, LAG Pinna nobilis, Društvo za razvoj slovenskega podeželja	23.-25.7.2020.
27.	Priprema projekta suradnje	sastanak	LAG Laura	1.10.2020.
28.	Stanje provedbe LEADER/CLLD, aktivacija tipa operacije 6.4.1. i pripreme za naredno razdoblje	On-line radionica	Ministarstvo poljoprivrede/Nacionalna ruralna mreža, LEADER Mreža Hrvatske, Hrvatska mreža za ruralni razvoj	27.-28.10.2020.

4. Vrednovanje provedbe putem pokazatelja LRS

Vrednovanje postignutih pokazatelja prema strateškim ciljevima i tipovima operacija u među-evaluacijskom razdoblju (Provjera napredovanja 2019.) provedeno je s obzirom na naznačene vrijednosti indikatora (mjerljivih pokazatelja) rezultata (*result indicators*) u LRS, te su prikazane u tablici u nastavku. S obzirom na kašnjenje u provedbi M19, te provedene izmjene LRS, vrednovanje je provedeno zaključno s danom 31.12.2020. godine.

Prema tablici 10, do kraja među-evaluacijskog razdoblja (31.12.2020.), u sklopu tipova operacija iz strateškog cilja 1., planirano je odobriti 20 projekata u iznosu 300.000,00 EUR-a. Do trenutka provedbe ove evaluacije, APPRRR je odobrila za financiranje 20 projekata ukupne vrijednosti 2.224.800,00 HRK, što prema tečaju propisanim prvim LAG natječajem za TO 1.1.1 od 7,416 HRK/EUR na dan 31.12.2018. godine, iznosi 300.000,00 EUR-a. Predviđeni broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata od 2 nova radna mjesta, putem sufinanciranih projekata nije postignut.

Nadalje, do kraja među-evaluacijskog razdoblja (31.12.2020.), u sklopu tipova operacija iz strateškog cilja 3., planirano je odobriti 7 projekata u iznosu 175.000,00 EUR-a. Do trenutka provedbe ove evaluacije, APPRRR je odobrila za financiranje 7 projekata ukupne vrijednosti 1.273.425,00 HRK, što prema tečaju propisanim prvim LAG natječajem za TO 3.1.1 od 7,4125 HRK/EUR na dan 29.10.2018. godine, iznosi 171.794,27 EUR-a. Predviđeni broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata od 1 novog radnog mjesta, putem sufinanciranih projekata nije postignut.

Tablica 11 Pregled ostvarenih indikatora prema strateškim ciljevima do 2020. godine

SC	Indikatori rezultata – Provjera napredovanja 2019.			Indikatori rezultata – Postignuto ⁹		
	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata	Ukupna javna sredstva odobrenih projekata (EUR)	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata	Ukupna javna sredstva odobrenih projekata	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata
SC1	20	300.000	2	20	2.224.800,00 HRK (xx EUR) ¹⁰	0
SC2	7	175.000	1	7	1.273.425,00 HRK (171.794,27 EUR) ¹¹	0

⁹ Evaluacija postignutih pokazatelja za projekte koji su odobreni za financiranje od strane APPRRR-a do 31.12.2020. godine.

¹¹ Po tečaju 7,4125, od 29.10.2018. (tečaj propisan Natječajem za TO 3.1.1)

6. Provedbeni kapaciteti LAG-a Krka

Sukladno LRS LAG-a Krka, a u skladu sa Statutom udruge i drugim internim aktima, provedbene kapacitete LAG-a Krka čine sva relevantna tijela udruge i ljudski kapaciteti zaduženi za djelovanje udruge i obavljanje njenih temeljnih zadataka. To su: Ured LAG-a (zaposlenici LAG-a), Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

6.1. Ured LAG-a Krka

Sjedište LAG-a Krka, ujedno i adresa ureda nalazi se na adresi Kralja Zvonimira 2, 22320 Drniš. LAG nema uspostavljenih podružnica, ni dislociranih ureda po ostalim JLS u svome sastavu. Od trenutka uspostave, sjedište LAG-u je jednom promijenilo adresu. Rad i direktna komunikacija s korisnicima se provode putem terenskih obilazaka po potrebi i akcijskom planu raspisivanja natječaja, tako da sve JLS i dijelovi LAG-a budu ravnomjerno zastupljeni. Ured LAG-a Krka, osim toga, redovito organizira posjete svim sektorima, članovima i subjektima.

Ured LAG Krka je 2017. godine imao je ukupno 2 zaposlene osobe na puno radno vrijeme, i to obje na poslovima provedbe LRS. U 2018. godini dodatno je zaposlena jedna osoba na stručnom osposobljavanju, tako da je Ured LAG-a imao ukupno 3 zaposlene osobe na puno radno vrijeme, sve na poslovima provedbe LRS. U 2019. godini dolazi do promjene zaposlenika u uredu LAG-a, te ujedno završava stručno osposobljavanje zaposlene osobe, tako da broj zaposlenih varira od jedne do tri zaposlene osobe na puno radno vrijeme. Unatoč navedenim promjenama i poteškoćama u pronalasku novih stručnih zaposlenika, LAG Krka je uspio održati kontinuitet zaposlenosti i rada ureda, a time i provedbe LRS¹². Broj zaposlenih u 2020. godini u uredu LAG-a Krka je 2 (voditeljica ureda i stručna suradnica), obje na puno radno vrijeme, čiji se troškovi rada financiraju se iz podmjere 19.4, a isti su prikazani u tablici 7. Trenutačnu u LAG-u nisu zaposlene osobe na ostalim radnim zadacima. Objе zaposlenice imaju dostatno radno i stručno iskustvo na području ruralnog razvoja, čemu dodatno doprinosi pohađanje edukacija, seminara i radionica za provedbu M19 u sklopu podmjere 19.4, što je detaljnije izneseno i opisano u tablici 10.

¹² Usljed navedenih promjena zaposlenih osoba i problema pronalaska novih zaposlenika, kako bi se održao kontinuitet rada i uspješnost provedbe LRS, uz potporu UO-a LAG-a, za provedbu nekih raspisanih od natječaja i tekućih aktivnosti, angažirani su vanjski stručnjaci, čiji je rad financiran iz dobivenih sredstava Šibensko-kninske županije za poticanje razvitka poljoprivrede u 2019. i 2020. godini.

Tablica 12 Ljudski kapaciteti Ureda LAG-a Krka u razdoblju 2017. – 2020. godine

Godina	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupan broj zaposlenih	2	3 ¹³	1 do 3 ¹⁴	2
Broj zaposlenih na puno radno vrijeme	2	3	1 do 3	2
Broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme	0	0	0	0
Broj zaposlenih na provedbi LRS	2	3	1 do 3	2
Broj zaposlenih na ostalim radnim zadacima	0	0	0	0

6.2. Upravni odbor LAG-a Krka

Upravni odbor izvršno je tijelo LAG-a koje sudjeluje u svim fazama provedbe LAG natječaja i odabira projekta, a prvenstveno u:

1. Donošenju internih akata i procedura vezanih uz postupak odabira projekata,
2. Izradi i usvajanju LAG Natječaja i njegovih izmjena, uključujući pripadajuće priloge, obrasce te kontrolne mehanizme, te
3. Donošenju Odluka o odabiru projekata.

Na dan 31.12.2020. godine, Upravni odbor broji 13 redovnih članova, pri čemu 5 članova dolazi iz gospodarskog, 3 iz civilnog, a 5 iz javnog sektora. Navedenom strukturom postiže se da niti jedan sektor nema više od 49 % glasačkih prava. Sukladno Statutu Udruge, zamjenske članove UO-a čine tri člana – jedan iz javnog i dva iz civilnog i/ili privatnog sektora, koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine.

U tablici u nastavku su iskazane evidentirane promjene u Upravnom odboru za koje je podnesen Zahtjev za promjenu u odnosu na podatke temeljem kojih je LAG odabran te sklopljen Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u, prema kojoj je vidljivo da nije došlo do promjene u strukturi članova Upravnog odbora te je LAG Krka kontinuirano ispunjavao uvjete prihvatljivosti temeljem kojih je odabran.

¹³ Jedna je osoba zaposlena na stručnom osposobljavanju.

¹⁴ U 2019. godini došlo je do promjene zaposlenika u uredu LAG-a. U travnju je otišla voditeljica, a dotadašnja stručna suradnica je privremeno obnašala dužnost voditeljice ureda (do 10.6., a potom je do 25.6. obnašala dužnost stručne suradnice, do isteka otkaznog roka), u svibnju je završilo i stručno osposobljavanje za jednog djelatnika. Tako da je do 20.5. radila samo jedna osoba. 20.5. počela je s radom nova stručna suradnica, a 10.6. zaposlena je nova voditeljica.

Tablica 13 Promjene Upravnog odbora LAG-a Krka

R. B.	Datum donošenja odluke od strane nadležnog tijela LAG-a	Datum podnošenja zahtjeva za odobrenje promjene	Datum donošenja odluke o odobrenju promjene	Vrsta promjene
1.	20.11.2017.	23.11.2017.	4.12.2017.	Promjena predstavnika članova
2.		17.4.2018.	14.5.2018.	Promjena u gospodarskom i civilnom sektoru UO, promjena predstavnika članova, izmjena statuta i promjena adrese sjedišta
3.	1.6.2020.	1.7.2020.	18.9.2020.	Promjena članova UO (javni i gospodarski sektor)

Prema Statutu udruge, Pravilniku o provedbi podmjere 19.2 te LRS, Upravni odbor LAG-a Krka, kao izvršno tijelo LAG-a, je sudjelovao u svim fazama provedbe do sada raspisanih LAG natječaja i odabiru projekta na LAG razini, što je ujedno vidljivo iz tablice u nastavku koja iznosi popis održanih sjednica UO-a te glavnih odluka i aktivnosti.

Tablica 14 Popis aktivnosti Upravnog odbora LAG-a Krka vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2019. godine

R. B.	Datum sjednice	Odluke/Aktivnosti
1.	16.10.2018.	Odluka o usvajanju natječajne dokumentacije za TO 3.1.1.; Odluka o raspisivanju natječaja za TO 3.1.1.; Odluka o datumu objave i datumu završetka natječaja za TO 3.1.1.; Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijave; Odluka o provedbi animacijskih aktivnosti za TO 3.1.1.
2.	3.12.2018.	Odluka o raspisivanju natječaja za TO 1.1.1.; Odluka o usvajanju natječajne dokumentacije za TO 1.1.1.; Odluka o datumu objave i završetka natječaja za TO 1.1.1.; Odluka o animacijskim aktivnostima za TO 1.1.1.;
3.	19.3.2019.	Odluka o odabiru članova Analize 1 i Ocjenjivačkog odbora za TO 3.1.1.
4.	26.3.2019.	Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za Prigovore
5.	5.6.2019.	Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijave za TO 1.1.1.; Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za TO 1.1.1.
6.	30.8.2019.	Donošenje Odluka o odabiru projekata pristiglih na natječaj za TO 3.1.1.; Donošenje Odluka o izmjeni natječaja za TO 1.1.1. (povećanju sredstava za TO 1.1.1.)
7.	30.1.2020.	Donošenje Odluka o odabiru projekata pristiglih na natječaj za TO 1.1.1.; Donošenje Odluke o odbijanju projektne prijave za TO 1.1.1.
9.	9.10.2020.	Odluka o izmjeni trećeg LAG natječaja za TO 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (izmjena priloga V – popis naselja)

6.3. Skupština LAG-a Krka

Skupština LAG-a Krka najviše je tijelo odlučivanja, a čine ju svi redovni članovi, sukladno Statutu udruge. Ustrojena je na način da niti jedna interesna skupina nema više od 49 % glasačkih prava. U kontekstu provedbe LRS osnovne ovlasti Skupštine su: usvajanje strateških razvojnih dokumenata s pratećom dokumentacijom, donošenje Programa rada udruge i financijskog plana za tekuću godinu, te usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća te Godišnjeg izvješća o radu udruge.

U prosincu 2020. godine Skupština LAG-a Krka brojila je 46 člana, od toga 9 predstavnika civilnog sektora, 25 gospodarskog i 12 javnog sektora. U tablici u nastavku je prikazan popis aktivnosti Skupštine LAG-a Krka vezanih uz postupak provedbe LRS do kraja 2020. godine.

Tablica 15 Popis aktivnosti Skupštine LAG-a Krka vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2020. godine

R. B.	Datum Skupštine	Odluke/Aktivnosti
1.	21.3.2016.	Odluka o usvajanju LRS LAG-a Krka za razdoblje 2014.-20202 (inicijalna LRS)
2.	21.11.2017.	Odluka o izmjeni LRS za razdoblje 2014.-2020. (Usklađenje LRS); Odluka o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS
3.	27.3.2018.	Usvajanje Pravilnika o procjeni i odabiru projektnih prijedloga (vezano za proceduru objave natječaja i obrade projekata prijavljenih na LAG natječaje)
4.	9.7.2018.	Odluka o izmjeni LRS-a LAG-a Krka za 2014.-2020. (1. Izmjena LRS); Odluka o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS.
5.	26.3.2019.	Donošenje Odluke o izmjeni LRS(2. izmjena LRS); Odluka o usvajanju izmjena Plana provedbe; Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o procjeni i odabiru projektnih prijedloga
6.	19.12.2019.	Usvajanje novog Pravilnika o procjeni i odabiru projektnih prijedloga
7.	3.9.2020.	Usvajanje izmjena LRS i Plana provedbe (3. izmjena LRS)

6.4. Nadzorni odbor LAG-a Krka

Sukladno Statutu LAG-a Krka, Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge, a prema LRS nadležno je tijelo za prigovore za odlučivanje o odabiru projekata u sustavu prigovora na odluke Upravnog odbora. Nadzorni odbor LAG-a Krka ima 3 člana, od kojih je jedan Predsjednik, a članove bira Skupština iz redova svojih članova. U razdoblju dosadašnje provedbe LRS nije bilo prigovora na odluke o odabiru projekata UO-a, stoga u ovom kontekstu nije bilo potrebe za njihovim zasjedanjem.

7. Vanjsko okruženje

Provedba Mjere 19, a samim time i provedba LRS LAG-ova u Hrvatskoj, regulirana je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. te nacionalnim pravilnicima koji reguliraju provedbu mjera Programa ruralnog razvoja. U tablici je iskazan popis Pravilnika za provedbu Mjere 19., odnosno pripadajućih podmjera 19.2, 19.3 i 19.4 i njihovih izmjena.

Tablica 16 Popis pravilnika za provedbu Mjere 19 PRR-a

Naziv pravilnika	Oznaka	Datum objave
Pravilnik o Provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.	NN 47/16	10. 5. 2016.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19. "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.	NN 108/2016	23. 11. 2016.
Pravilnik o provedbi podmjere 19.2."Provedba operacija unutar CLLD strategije", podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)	NN 96/2017	27. 9. 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«	NN 53/2018	8. 6. 2018.
Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.- 2020.	NN 91/2019	24. 9. 2019.

Sukladno regulatornom okviru natječaj je na razini LAG-a moguće objaviti nakon aktivacije TO od strane APRRRR-a. U predstojećoj tablici je iznesen kronološki pregled aktivacije LAG natječaja i raspisivanja natječaja za provedbu LRS od strane APRRRR. Za podnošenje Zahtjeva za potporu za projekte odabrane na LAG razini i daljnju provedbu odabranih projekata relevantan je i odgovarajući natječaj za provedbu pojedinih tipova operacije putem LRS.

Tablica 17 Popis tipova operacija aktiviranih od strane APRRRR-a

TO (PRR)	Datum aktiviranja LAG natječaja od strane APRRRR-a	Datum objave natječaja za provedbu operacija putem LRS od strane APRRRR-a
6.3.1	9. 2. 2018.	3. 8. 2018.
7.4.1	29. 6. 2018.	20. 2. 2019.
4.2.1	5. 12. 2018.	2. 10. 2019.
4.1.1	1. 2. 2019.	4. 10. 2019.

6.4.1	04.11.2020.	20.11.2020.
8.5.2	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
3.1.1	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
4.1.3	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
4.4.1	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
16.4.1	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
3.2.1	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju
6.2.1.	Nije aktiviran u evaluacijskom razdoblju	Nije raspisan u evaluacijskom razdoblju

8. Analiza rizika i provedenih aktivnosti za ublažavanje

U Dodatku 7 LRS je iznesena analiza rizika i mjera za njihovo ublažavanje u provedbi LRS LAG-a Krka. U tablici u nastavku su iznesene provedene aktivnosti s ciljem ublažavanja prepoznatih rizika. LAG Krka je u dosadašnjem radu adekvatno djelovao prema ublažavanju i izbjegavanju prepoznatih rizika.

Tablica 18 Pregled provedbe aktivnosti ublažavanja rizika

Rizik	Predviđene preventivne aktivnosti	Provođenje (Da/Ne/Djelomično)
Nemogućnost privlačenja i zadržavanja kvalitetnih zaposlenika, odnosno odlazak ključnih zaposlenika	Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-a. Kvalitetna potpora članovima ureda od strane izvršnih tijela. Stabilne financije.	DA. LAG se u 2019. suočio s odlaskom djelatnica (voditeljicom i stručnom suradnicom). Na te funkcije su došle nove djelatnice, koje nisu u početku imale adekvatno znanje o radu LAG-a. Uz podršku UO LAG-a, angažirani su vanjski stručnjaci kako bi pomogli u provedbi LRS-a LAG-a.
Resursi zaposlenika/članova ureda LAG-a nisu dovoljni za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima/neučinkovitost korištenja resursa	Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. Potpora UO LAG-a. Stalni monitoring i evaluacija ljudskih resursa. Korištenje vanjskih suradnika. Edukacija članova ureda LAG-a.	DA. S obzirom na gore navedeno, za provedbu podmjere 19.2. LAG je angažirao vanjske stručnjake prilikom obrade projektnih prijava za TO 3.1.1. ali i TO 1.1.1. Jedno vrijeme djelatnice su angažirale i mentora kako bi se provedba LRS LAG-a neometano nastavila te se ispunile obveze iz Ugovora.
Nedostatno planiranje/upravljačka znanja članova lokalnog partnerstva	Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje rada LAG-a, trening/edukacije članova LAG-a, posebno donositelja operativnih odluka – članova u UO LAG-a. Edukacija članova UO LAG-a.	Djelomično. Početkom svake godine Nadzorni odbor LAG-a Krka se sastaje te vrše nadzor poslovanja rada LAG-a, ocjenu odredbi Statuta i drugih općih akata udruge, ocjena zakonitosti financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima LAG-a Krka. Kako su članovi LAG-a uglavnom zaposleni edukacije nisu moguće u onom obimu koliko bi trebalo. Ali redovito su obavješteni o svojim

		obvezama i odgovornosti kao članova UO LAG-a.
Nedostatak vještina/predanosti članova lokalnog partnerstva	Redovna organizacija treninga i edukacija. Angažiranje drugih članova LAG-a – uključivanje volontera, kako bi se nadopunilo znanje i vještine ureda LAG-a.	Djelomično. S obzirom na kapacitete ureda LAG-a te obveze u provedbi LRS, LAG nije u mogućnosti redovno organizirati treninge i edukacije. Kao primjer organiziranja treninga navodimo studentsko putovanje u NP Plitvička jezera. Tijekom putovanja kroz razne vježbe i rad u grupama radilo se na uspostavljanju direktnih kanala komunikacije među članovima kako bi provedba LRS LAG-a Krka, odnosno funkcioniranje tijela LAG-a bilo što učinkovitije.
Neučinkovita organizacijska/upravljačka struktura	Stalan monitoring provedbe poslovnog plana te procesa i procedura. Edukacija izvršnih tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada.	Da. Gore već spomenuto studentsko putovanje te rad Nadzornog odbora kroz nadzor poslovanja LAG-a.
Sukob interesa u donošenju odluka	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa. Osiguranje dovoljnog znanja i vještina članova LAG-a za nezavisno donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, osobito vezanom uz donošenje odluka o odabiru projektnih prijedloga važna je Izjava o nepristranosti koja omogućuje objektivni pristup u postupcima odabira.	DA. Kako bi izbjegli ovaj rizik prilikom svake sjednice članovi LAG-a su upoznati o potrebi izbjegavanja sukoba interesa, a naročito Upravni odbor LAG-a koji donosi Odluke o odabiru projektnih prijedloga. Te im se prilikom poziva na sjednicu šalju materijali (Izjava o nepristranosti i povjerljivosti, te izjava o nepostojanju sukoba interesa) kako bi se sukob interesa izbjegao. Ukoliko je neki od članova UO LAG-a u sukobu interesa, aktivira se zamjenski član iz odgovarajućeg sektora kako bi se osigurala dovoljna zastupljenost pojedinog sektora prilikom odlučivanja.
Nametanje dodatnih odgovornosti bez financiranja	Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja.	Djelomično. S obzirom da Skupština LAG-a svake godine donosi Financijski plan, a početkom svake godine Nadzorni odbor LAG-a Krka se sastaje te vrše nadzor poslovanja rada LAG-a, svi članovi su upoznati sa financijama, odnosno dodatne odgovornosti nisu nametane.
Negativan publicitet	Jačanje identiteta LAG-a kao posebne organizacije, jačanje aktivnosti LAG-a, informiranje što šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a.	DA. LAG Krka redovito obavještava javnost o provedbi LRS. Naročito onih aktivnosti koje su od interesa za javnost, a to su Natječaji iz podmjere 19.2. i njihove provedbe, održavanju radionica i sl.
Promjena smjernica Vladinih politika posebno vezanih uz provedbu	Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR.	DA. LAG uspješno surađuje s nadležnim institucijama za provedbu Programa ruralnog razvoja. Osobito u provedbi podmjere 19.2.

ruralnog razvoja i djelovanja udruga	Suradnja s LEADER mrežom Hrvatske kao tehničkom pomoći, suradnja s Upravnom direkcijom i APPRRR-om.	Redovito se odazivamo radionicama koje se održavaju u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, APPRRR-a, LEADER Mreže Hrvatske. Od prošle godine ponovno smo članovi LEADER Mreže Hrvatske, nakon kratke pauze.
Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika podmjere 19.2.	Aktivnosti za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju. Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje financijskih sredstava od strane financijskih institucija i organizacija.	DA. LAG se svake godine prijavljuje na javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede, kako bi ishodovali financijska sredstva za rad LAG-a i provedbu LRS. Također, do prošle godine (2020. g. nije bilo natječaja zbog COVID-a) prijavljivali smo se i na natječaj NP Krka.
Nepovoljni međusobni odnosi multisektorskih dionika – članova LAG-a, posebno članova Upravnog odbora	Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje dionika i široke javnosti.	Djelomično. O svojim aktivnostima, LAG redovno izvješćuje dionike ali i široku javnost. Osobito o provedbi novih natječaja s obzirom da javnost to najviše interesira.

9. Dodana vrijednost provedbe LRS LAG-a Krka

U među-evaluacijskom razdoblju LAG Krka sudjeluje kao nositelj na projektima i aktivnostima financiranim izvan mjere 19 PRR-a, što dodatno doprinosi uspješnosti provedbe LRS i dostizanju njenih ciljeva, jačanju kapaciteta LAG-a i njegovih dionika i ciljnih skupina, umrežavanju područja LAG-a te stvaranju partnerstava unutar i izvan LAG područja, međusektorskoj suradnji te pozicioniranju LAG-a kao utjecajnog nositelja lokalnog razvoja na obuhvatnom LAG području. U nastavku je naveden pregled projekata u kojima je LAG Krka sudjelovao te opis i rezultati svakog projekta i aktivnosti.

Tablica 19 Pregled ostalih projekata i aktivnosti LAG-a Krka

Naziv projekta/aktivnosti/inicijative	Uloga LAG-a	Izvor financiranja	Područje provedbe	Broj sudionika	Datum/Razdoblje provedbe
"Ekološki ljekoviti park - vrtlarjenje je "IN"	nositelj	Zaklada "Kajo Dadić" (Decentralizirani model financiranja od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva)	Općina Promina	69	8.9.2017.-26.9.2017.

"Darovi Krke / Gifts of Krka - LAG Krka Info point"	nositelj	Nacionalni park "Krka"	Područje LAG-a Krka	3	2017.
"E-Krka-klikom svuda"	nositelj	Nacionalni park "Krka"	Područje LAG-a Krka	2	2018.
"Potpora LAG-u Krka u provedbi LRS LAG-a Krka"	nositelj	Nacionalni park "Krka"	Područje LAG-a Krka	3	2019.
Organizacija studijskog putovanja u NP Plitvička jezera	nositelj	Šibensko-kninska županija, "Potpora LAG-u Krka u provedbi Lokalne razvojne strategije"	PP Plitvička jezera	22	Prosinac 2018.
Refundacija dijela tekućih troškova	nositelj	Šibensko-kninska županija	Područje LAG-a Krka	Np	2019.
Izrada nove web stranice LAG-a, izrada promotivnih materijala, refundacija dijela tekućih troškova	nositelj	Šibensko-kninska županija	Područje LAG-a Krka	Np	2020.

"Ekološki ljekoviti park - vrtlarenje je "IN"

Tijekom 2017. godine, LAG-u su odobrena sredstva od strane zaklade Kajo Dadić za provedbu projekta Ekološki ljekoviti park – Vrtlarenje je IN u sklopu kojeg je uređen ekološki ljekoviti park u dvorištu škole u Oklaju. Cilj projekta je povećanje interesa za oplemenjivanje okoliša kroz popularizaciju vrtlarenja, poticanje sadnje ljekovitog bilja i voća, kao i promoviranje volonterstva. U suradnji s LAG-om Krka, OŠ Jakov Gotovac iz Unešića, uspješno je izvršila prijavu kojom su joj odobrena financijska sredstva za provedbu akcije Divanimo na selu, u sklopu koje su opremljeni prostori za međugeneracijsko druženje u naselju Mirlović Zagora.

"Darovi Krke / Gifts of Krka - LAG Krka Info point"

U kolovozu 2017. godine, LAG-u Krka dodijeljena su sredstva iz proračuna JU NP Krka za provedbu projekta „Darovi Krke/Gifts of Krka – LAG Krka info point“, u iznosu od 30.000 kn. Projektom se nastojala pokrenuti akcija promocije proizvoda i usluga članova iz gospodarskog sektora s ciljem ostvarenja jednog od glavnih ciljeva LRS LAG-a Krka – održivi gospodarski razvoj. „Darovi Krke“ info point se sastoji od tri elementa koji u praksi mogu djelovati kao odvojeni promo materijali:

- Standee – ekološki nosač letaka – napravljen od kartona sadrži logo LAG-a Krka, sadrži min. 12 mjesta za izlaganje letaka, a biti će postavljeni na frekventnim mjestima tijekom turističke sezone.
- Grupni katalog – turistička mapa – riječ je o jednostavnoj turističkoj mapi šireg područja NP Krka na kojoj su označene glavne atrakcije, pristupne ceste, okolna mjesta te lokaliteti članova LAG-a s ponudom autohtonih poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda.
- Pojedinačni katalozi – ID brošura pojedinačnih članova LAG-a s predstavljanjem civilnog sektora, usluga i javnog sektora.

Odobrena sredstva doprinijela su realizaciji ciljeva promotivne akcije/projekta: Promocija proizvoda i usluga članova LAG-a na turističkom tržištu; promocija proizvoda i usluga članova LAG-a na lokalnom tržištu; promocija rada LAG-a u lokalnoj zajednici; podizanje vidljivosti aktivnosti LAG-a među institucijama; provedba ciljeva LRS-a LAG-a Krka; jačanje kapaciteta LAG-a Krka.

„MA DA – Mladi, a društveno angažirani“

U 2018. godini LAG je postao dijelom projekta „MA DA – Mladi, a društveno angažirani“. Riječ je o projektu u kojem će studenti Veleučilišta u Kninu putem LAG-ova pomoći lokalnim poljoprivrednicima oko pitanja vezanih uz poljoprivredu i stočarstvo. Projekt sufinanciraju Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a nositelj projekta je Udruga Žena iz Drniša. Opći cilj projekta je uspostaviti održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

"E-Krka-klikom svuda"

LAG-u KRKA na temelju provedenog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP KRKA“ za 2018. godinu, odobrena su sredstva u iznosu od 8.450,00 kn za financijsku podršku projekta: „E-KRKA-KLIKOM SVUDA“. Navedena sredstva su sukladno Ugovoru utrošena za financiranje jednog stolnog računala i dodatne uredske opreme (uništavač papira) kojom smo osnažili kapacitete samog ureda LAG-a KRKA. Novom opremom koja uključuje stolno računalo i dodatnu uredsku opremu osnažili smo kapacitete samog ureda LAG-a, te ćemo samim time kvalitetnije informirati i educirati naše članove i druge korisnike (u vidu pružanja savjeta, edukacija i animacijskih aktivnosti). Također, nova oprema služi i kao servis našim članovima tijekom pripreme za prijavu na natječaje iz PRR RH 2014.-2020., ali i druge dostupne izvore financiranja. Naime, naši članovi se često susreću s poteškoćama tijekom procesa prijave na otvorene natječaje, iz razloga što iste zahtijevaju određenu opremu kao npr: skener, fotokopirni uređaj, računalo, pristup internetu i dr., te im novom opremom ured našeg LAG-a stoji na raspolaganju za navedeno.

Tijekom 2018., 2019. i 2020. godine, LAG Krka je korisnik financijskih sredstava Šibensko-kninske županije za poticanje razvitka poljoprivrede u 2018. godini "**Potpore LAG-u Krka u provedbi Lokalne razvojne strategije**". Ista su 2018. godine uložena za realizaciju studijskog putovanja u JU NP Plitvička jezera kojeg je organizirao LAG za dvadesetak svojih članova. Cilj studijskog putovanja bio je umrežavanje i povezivanje članova LAG-a Krka. Tijekom putovanja kroz razne vježbe i rad u grupama radilo se na uspostavljanju direktnih kanala komunikacije među članovima kako bi provedba LRS LAG-a Krka, odnosno funkcioniranje tijela LAG-a bilo što učinkovitije. Za određene putovanja odabrana su Ju NP Plitvička jezera zbog primjera dobre prakse – utjecaja JU na razvoj lokalne zajednice, osobito u dijelu povećanja ponude domaćih i autohtonih proizvoda na rubnim dijelovima NP-a. Razlog posjeti JU NP Plitvička jezera bio je i sudjelovanje na radionici pod nazivom Via Dinarica – pustolovni koridor za održivi razvoj, a između ostalog razgovaralo se o idejama za pripremu i provedbu podmjere 19.3.

Sredstva iz 2019. godine su uložena u refundaciju troškova koji nisu odobreni iz podmjeru 19.4. te za uslugu mentoriranja i trošak Analize 1 projektnih prijava pristiglih na LAG Natječaj TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Zbog izvanredne situacije u 2019. godini došlo je do promjene zaposlenika ureda LAG-a, dok su prijave za prvi i drugi LAG natječaj bile otvorene. S obzirom na novonastalu situaciju, a kako bi se prijave projekata uspješno obradile nove zaposlenice su od Upravnog odbora tražile dopuštenje za angažiranje vanjskog stručnjaka za obradu projektnih prijava, ali i kao pomoć za uhodavanje u poslove vođenja ureda. Cilj provedbe ovog projekta je osiguranje stabilnosti ureda LAG-a, jačanje kapaciteta, te ispunjavanja ugovorenih obveza LAG-a Krka i APPRRR-a. U 2020. godini ostvareno je 30.000,00 kuna potpore od strane Šibensko-kninske županije. Sredstva su utrošena na izradu nove web stranice LAG-a Krka, izradu promotivnih materijala LAG-a te na trošak Ocjenjivačkog odbora za TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava od 28.rujna 2020. godine (3. LAG natječaj).

10. Opća ocjena provedbe LRS i djelovanja LAG-a Krka

Iznošenje opće ocjene dosadašnje provedbe LRS i djelovanja LAG-a Krka, provest će se kroz odgovore na postavljena evaluacijska pitanja u nastavku, kako bi se stekao uvid u ostvarivanje strateških elemenata LRS, kao što su ostvarenje vizije, uvažavanje prepoznatih razvojnih potreba, primjena CLLD načela, dosadašnji doprinos provedbe LRS inovacijama, interesima i potrebama ciljnih skupina, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, te integraciji i umrežavanju područja LAG-a.

1. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka odgovorila na identificirane razvojne potrebe?

LRS LAG-a Krka razvojne potrebe iznosi kroz analizu stanja, izdvajajući ih prema ključnim tematskim cjelinama, pa sukladno tome iznosi sektorski i tematski grupirane potrebe prirodno-geografskih faktora, prirodne i kulturne baštine, komunalne, prometne i ostale javne infrastrukture, razvijenosti područja, općenito gospodarstva s izdvojenim pojedinim privrednim granama, tržišta radne snage, demografskih i socijalnih značajki, kulture, zdravstva i civilnog društva.

Provedbom LRS, tj. odabranih tipova operacija, u najvećoj će se mjeri djelovati prema razvojnim potrebama gospodarstva, tj. poljoprivrede, zatim javne infrastrukture, dok će preostale prepoznate razvojne potrebe biti tek djelomično uvažene. Ovome uvelike doprinosi način provedbe LRS u kojem LAG Krka tek djelomično ima mogućnost intervenirati u kreiranju LAG natječaja, a time i uvažavanja svojih razvojnih potreba. Dodatno, razvojne potrebe se uvažavaju kroz aktivnosti i projekte financirane izvan mjere 19, u kojima LAG Krka sudjeluje. Ovi su projekti i pojedinačne aktivnosti značajno doprinijeli uvažavanju razvojnih potreba područja LAG-a Krka prema opisanim potrebama u LRS.

Od prepoznatih razvojnih potreba provedbom LRS i radom LAG-a Krka djelovalo se prema:

- unapređenju male javne infrastrukture i sadržaja,
- poticanju i promociji postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva kao najvažnije nositelje poljoprivredne proizvodnje na području LAG-a Krka, kroz modernizaciju njihovog poslovanja i povećanje proizvodnje,
- jačanju kapaciteta i suradnje lokalnih razvojnih dionika,
- povezivanju i umrežavanju područja LAG-a Krka.

34

Od preostalih najznačajnijih razvojnih potreba istaknutih u LRS LAG-a Krka, u narednom je razdoblju potrebno djelovati prema:

- daljnjem unapređenju i razvoju javne infrastrukture i sadržaja,
- poticanju razvoja gospodarstva i ulaganja, a posebice malog i srednjeg poduzetništva kako bi se otvorila nova radna mjesta,
- povezivanju udruga s javnim sektorom s ciljem što kvalitetnijeg razvoja civilnog društva i lokalne zajednice,
- poticanje međusektorske suradnje
- generacijskoj obnovi poljoprivrednih gospodarstava i dr.

2. U kojoj je mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka ostvarila viziju navedenu u LRS?

Vizija LAG-a Krka je:

LAG Krka je nadaleko poznat po svom jedinstvenom fenomenu suživota vode, kamenitog krškog tla i čovjeka u su-stvaranju prirodnih i kulturnih vrijednosti, događanja, eno-gastronomskih specijaliteta, tradicionalnih i inovativnih proizvoda, usluga, te raznovrsnih sadržaja aktivnog

odmora, rekreacije i zabave koji privlače i nadahnjuju ljude na život, rad i osobno ispunjenje u suglasju s prirodnom i društvenom okolinom.

Vizija navedena u ovakvom izričaju naglašava i prepoznaje raznolikost i bogatstvo prirodnih potencijala kao resursa za stvaranje privlačnog i visokokvalitetnog životnog prostora, kao i mjesta posjećivanja radi odmora, rekreacije i zabave te valoriziranja, korištenja i doživljavanja jedinstvenih i visokokvalitetnih sadržaja i proizvoda ovog prostora.

Iz navedenih odrednica slijedi logično postavljeni strateški okvir LRS, tj. odabir strateških ciljeva, prioriteta i mjera i tipova operacija za postizanje vizije. Dosadašnjom provedbom LRS i radom LAG-a Krka, ostvarenju vizije se doprinijelo kroz SC1, tj. odabirom za financiranje 20 projekata iz sektora poljoprivrede, te 7 projekata za postizanje SC3 za unaprjeđenje male javne infrastrukture, koji ujedno uvažavaju razvojne potrebe područja. Izostavljanjem SC2 iz provedbe LRS izmjenama, a kao što je opisano u poglavlju 2.1., neće se djelovati prema postizanju dijela vizije o unaprjeđenju i stvaranju raznovrsnosti gospodarske osnove prostora.

3. Na koji se način i u kojoj mjeri dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka vodila ciljevima primjene LEADER pristupa u RH?

Ciljevi primjene LEADER pristupa u RH odnose se na: (1) Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva, (2) Unaprjeđenje i promicanje politike ruralnog razvoja, (3) Podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja, (4) Povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva, (5) Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući i dobrobit, (6) Stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade i (7) Diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

Dosadašnja provedba LRS, kao i rad LAG-a Krka u potpunosti se zasniva na i primjenjuje sve navedene ciljeve LEADER pristupa u RH. Organizacija, tj. udruga LAG Krka je po svojoj temeljnoj definiciji i načinu ustrojstva lokalno partnerstvo proizašlo iz inicijative lokalnih dionika, čija je temeljna uloga i cilj, ujedno navedeni u Statutu udruge, ruralni razvoj, kao i razvoj ruralnog prostora.

Tri opća prioriteta za politiku ruralnog razvoja uključuju poticanje konkurentnosti u poljoprivredi, održivo upravljanje prirodnim resursima i djelovanja protiv klimatskih promjena te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. Navedeni prioriteti politike ruralnog razvoja su kroz dosadašnju provedbu LRS LAG-a Krka promovirani financiranjem projekata iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, sudjelovanjem LAG-a u aktivnostima i projektima koji djeluju protiv klimatskih promjena te potiču ekologiju i održivo upravljanje resursima.

Nadalje, pristup odozdo prema gore se u dosadašnjoj provedbi LRS LAG-a Krka u najvećoj mjeri ostvarivalo kroz participativne radionice i sudjelovanje javnosti u procesu izrade LRS, te

animacijske i informacijske aktivnosti u organizaciji LAG-a Krka koje su održavane s ciljem informiranja potencijalnih korisnika LAG natječaja.

Informiranost i educiranost ruralnog stanovništva LAG-a Krka se u dosadašnjoj provedbi LRS provodila kroz animacijske i informacijske aktivnosti LAG-a. Informiranost se dodatno postizala redovitim medijskim objavama od strane ureda LAG-a Krka o temama relevantnim za poljoprivredu, ruralni razvoj i općenito lokalnu zajednicu, ali i o tijeku provedbe LRS te raspisivanju LAG natječaja. Medijske objave su obuhvaćale društvene mreže LAG-a Krka (putem facebook objava), službenu internetsku stranicu LAG-a, službene internetske stranice jedinica lokalne samouprave u sastavu LAG-a, novinske objave te lokalne i regionalne radio postaje. Također, LAG Krka redovito na mjesečnoj razini objavljuje e-bilten „LAG Krka info“, putem kojeg širu javnost obavještava o tekućim i provedenim aktivnostima LAG-a. Edukacije i informiranost lokalnog stanovništva su se dodatno provodile prema specifičnim temama u sklopu ostalih aktivnosti i projekata u kojima je LAG sudjelovao.

Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta se kroz dosadašnju provedbu LRS LAG-a Krka postiže provedbom projekata financiranih iz natječaja za tip operacije 3.1.1, tj. ulaganjima u malu komunalnu i/ili društvenu i/ili javnu infrastrukturu, za koju je odobreno ukupno 7 projekata.

Dosadašnje djelovanje LAG-a Krka je doprinijelo stvaranju novih, održivih mogućnosti zarade informiranjem lokalnog stanovništva o raspisanim LAG natječajima, te potencijalnim uvjetima koji pružaju mogućnosti investicija kroz njih.

Prema mjerljivim pokazateljima prikazanim u poglavlju 4., dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka nije izravno doprinijela stvaranju novih radna mjesta, međutim ulaganjima kroz odobrene projekte zasigurno je pridonijela njihovom očuvanju.

5. U kojoj mjeri i na koje načine je dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka doprinijela zaštiti okoliša i klimatskim promjenama te promicanju interesa ciljnih skupina LAG-a?

Dosadašnja provedba LRS LAG-a Krka je doprinijela zaštiti okoliša i klimatskim promjenama kroz poticanje ekološke poljoprivrede te ulaganja unutar zaštićenih područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, koji su uključeni u kriterije odabira predmetnih natječaja. Osim kroz provedbu LRS, LAG Krka je posebice pridonio zaštiti okoliša i klimatskim promjenama sudjelovanjem u ostalim aktivnostima i projektima, među kojima se ističu projekti "Ekološki ljekoviti park - vrtlarjenje je "IN" i "Darovi Krke / Gifts of Krka - LAG Krka Info point".

Prema Statutu LAG-a Krka ciljane skupine obuhvaćaju veliki broj lokalnih dionika, kao što su: djeca, mladi, osobe starije životne dobi, lokalna i regionalna samouprava, poljoprivrednici i ribari, poslovne organizacije, mali i srednji poduzetnici, žene i žene poduzetnice, ruralno stanovništvo, odgojno-obrazovne ustanove, potrošači, udruge i građanske inicijative, osobe u riziku od siromaštva, volonteri i dr. Sukladno osnovnoj ulozi i dosadašnjim mogućnostima, LAG Krka je

putem provedbe LRS i podmjere 19.2 u najvećoj mjeri promicao interese poljoprivrednika, malih i srednjih poduzetnika u poljoprivredi, ruralnog stanovništva te lokalne samouprave, s obzirom da je najveći broj prihvatljivih korisnika na LAG natječajima potencijalno mogao biti iz ovih interesnih skupina. Osim navedenoga, kroz projekte financirane iz drugih izvora promicani su interesi drugih ciljnih skupina navedenih u Statutu udruge, sukladno tematici samih projekata. Očekuje se daljnje promicanje interesa ciljnih skupina kroz odabir projekata u kojima će LAG Krka sudjelovati, bilo kroz provedbu LRS ili druge aktivnosti/projekte.

11. Zaključci s preporukama

Prema rezultatima evaluacije provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2020. godina te rada LAG-a Krka mogu se donijeti slijedeći zaključci s preporukama:

1. LAG Krka je do sada adekvatno i prema odredbama relevantnog Upravljačkog tijela, a istodobno uvažavajući lokalne potrebe i potencijale, izvršavao jedan od svojih temeljnih zadataka provedbe LRS. Ovome su u najvećoj mjeri doprinijeli slijedeći čimbenici: informirana i educirana stručna služba LAG-a, provođenje dovoljnog broja animacijskih i informacijskih aktivnosti prema krajnjim korisnicima i tijelima LAG-a, promidžba LAG-a Krka, te kontinuirana komunikacija i analiza potreba krajnjih korisnika koja je omogućila pravovremene intervencije u izmjenama LRS, kako bi se u konačnici omogućila njena učinkovita i efikasna provedba. U daljnjoj provedbi preporuka je nastaviti pratiti rad i preporuke Upravljačkog tijela, uključujući novodonesene ili izmijenjene zakonske i podzakonske akte u području ruralnog razvoja, te sudjelovati u radu drugih relevantnih LEADER/CLLD organizacija, kontinuirano pratiti potrebe i potencijale lokalnih dionika i potencijalnih krajnjih korisnika.

2. Osim svoje temeljne uloge provedbe LRS, LAG Krka je u svom dosadašnjem radu adekvatno djelovao prema postizanju općih horizontalnih i razvojnih ciljeva, čime se sve više pozicionira kao važan razvojni dionik prostora kojeg obuhvaća. Posebice se odnosi na aktiviranje ciljnih skupina i prepoznavanje razvojnih prioriteta, provedbom projekata i sudjelovanjem u aktivnostima financiranim izvan mjere 19. U daljnjem djelovanju organizacije preporuka je kontinuirano pratiti potencijale i potrebe dionika i korisnika, uključujući redovito praćenje i ažuriranje projektnih ideja i inicijativa te okupljanje, animiranje, informiranje i educiranje potencijalnih korisnika.

1. Neophodno je u daljnjem provedbenom razdoblju provesti četvrtu izmjenu LRS kako bi se alocirala novo-dodijeljena financijska sredstva za prijelazno razdoblje, kao i dio financijskih sredstava koji nije raspisan kroz LAG natječaje sukladno referencama 2 i 6. Pri tome će biti nužno sagledati potencijalne mogućnosti za povratkom TO iz prijašnjih verzija LRS, a prije svega sukladno iskazanom interesu potencijalnih korisnika. Osim toga, preporuka je sagledati mogućnosti i

potencijale za uspostavom jednog ili više projekata suradnje, a sukladno tome i alokacijom dijela novo-dodijeljenih sredstava na podmjeru 19.3. Ovim bi se djelovalo prema prioritetnim područjima i potrebama koje su iskazane kroz LRS, a na koje nije moguće djelovati kroz provedbu podmjere 19.2.

2. Preporuka je provesti naknadno (*ex-post*) vrednovanje LRS te kontinuirano praćenje provedbe, kako bi se i dalje uspješno i pravovremeno interveniralo prema promjenama u zakonskim i provedbenim smjernicama politike ruralnog razvoja RH i EU, te kako bi se po završetku provedbe LRS ocijenilo postizanje ciljnih pokazatelja u LRS.

3. Na poslijetku, preporuka je daljnje jačanje kapaciteta svih dionika i tijela LAG-a Krka, te promicanje interesa ciljnih skupina, posebice iniciranjem ili sudjelovanjem članova, zaposlenika, volontera LAG-a Krka u aktivnostima i projektima, kako bi se u što većoj mjeri moglo djelovati prema prepoznatim razvojnim potrebama i ostvariti prioritete, strateški ciljevi, te u konačnici definirana vizija LRS LAG-a Krka.

Popis slika i tablica

Slika 1 Vrijednost odobrenih projekata prema interesnim sektorima	14
Slika 2 Vrijednost odobrenih projekata prema sjedištu korisnika.....	15
Tablica 1 Odobreni iznosi LRS LAG-a Krka prema podmjerama prema Ugovoru	6
Tablica 2 Pregled odabranih strateških ciljeva, mjera i tipova operacija LRS LAG-a Krka – VO	7
Tablica 3 Provedene promjene LRS LAG-a Krka u razdoblju 2017.-2020.....	8
Tablica 4 Pregled izmjena financijske alokacije prema strateškim ciljevima LRS LAG-a Krka.....	9
Tablica 5 Pregled izmjena financijske alokacije prema mjerama LRS LAG-a Krka	9
Tablica 6 Pregled izmjena financijske alokacije prema tipovima operacija LRS LAG-a Krka.....	10
Tablica 7 Pregled objavljenih LAG natječaja iz LRS LAG-a Krka u razdoblju 2017.-2020.	13
Tablica 8 Iznos isplaćenih sredstava LAG-a Krka po kvartalima	17
Tablica 9 Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 – Aktivnosti za potencijalne korisnike mjera definiranih LRS LAG-a Krka2014. – 2020.	18
Tablica 10 Pregled provedenih aktivnosti u sklopu podmjere 19.4 – Sudjelovanje članova, zaposlenika i volontera LAG-a Krka na radionicama, sastancima i konferencijama vezanim uz provedbu mjere 19 i LEADER/CLLD pristupa i provedbe LRS u organizaciji drugih pravnih osoba.....	19
Tablica 11 Pregled ostvarenih indikatora prema strateškim ciljevima do 2020. godine.....	22
Tablica 12 Ljudski kapaciteti Ureda LAG-a Krka u razdoblju 2017. – 2020. godine.....	24
Tablica 13 Promjene Upravnog odbora LAG-a Krka.....	25
Tablica 14 Popis aktivnosti Upravnog odbora LAG-a Krka vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2019. godine	25
Tablica 15 Popis aktivnosti Skupštine LAG-a Krka vezanih za postupak provedbe LRS u razdoblju 2017. – 2020. godine	26
Tablica 16 Popis pravilnika za provedbu Mjere 19 PRR-a	27
Tablica 17 Popis tipova operacija aktiviranih od strane APPRRR-a	27
Tablica 18 Pregled provedbe aktivnosti ublažavanja rizika.....	28
Tablica 19 Pregled ostalih projekata i aktivnosti LAG-a Krka	30

PRILOG 1 Pregled odabranih i odobrenih projekata na 31.12.2020.

R.B.	Naziv projekta	LAG Natječaj	TO	Status 31.12. 2020. godine	Iznos odobrenih sredstava (HRK)	JLS	Sektor	Opis ulaganja (aktivnosti)
1.	Rekonstrukcija zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz	1. LAG Natječaj	3.1.1. (sukladan nacionalnom 7.4.1.)	Ugovor sklopljen s APPRRR-om	185.312,5	Općina Promina	JAVNI	Aktivnosti u svrhu izvođenja radova na rekonstrukciji zelene površine sa sanitarijama sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: građevinski i zanatski radovi(zemljani, betonski i armirano betonski, zidarski, izolaterski, limarski, pokrivački, stolarski, bravarski, završni zidarski, gipsarski, kamenarski, keramičarski, soboslikarski i ličilački radovi) i vodovodne instalacije i odvodnja(građevinarski radovi, instalacije vodovodne mreže, instalacija odvodnje, sanitarni predmeti i uređaji), - trošak projektno-tehničke dokumentacije, - usluga stručnog nadzora
2.	Izgradnja sustava za navodnjavanje na nogometnom igralištu NK DOŠK u Drnišu	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	185.312,5	Grad Drniš	JAVNI	Ugradnja sustava za navodnjavanje na nogometnom igralištu (pripremi, zemljani, instalaterski i montažerski radovi, razni radovi), - trošak stručnog nadzora radova
3.	Unutarnje uređenje i opremanje društvenog doma/kulturnog	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	185.312,50	Općina Ružić	JAVNI	Troškovi uređenja društvenog doma: prostorija za izlaganje, ulazna lođa, foyer, prostorija za prezentaciju, kuhinja, slikarsko kiparska radionica, soba za goste, čajna kuhinja, stubište, - trošak projektno-tehničke dokumentacije,

	centra u Otavicama							- trošak usluge i pripreme projektno-tehničke dokumentacije
4.	Dom kulture Unešić - rekonstrukcija i opremanje	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	185.312,50	Općina Unešić	JAVNI	Aktivnosti uključuju: rušenje i demontažu, zidarske radove, gipskartonske radove, podopolagačke radove, keramičarske radove, soboslikarske radove, izolaterske radove, stolarske radove; troškove opremanja dvorane, pozornice, oprema garderobe i sanitarnog čvora - trošak projektno-tehničke dokumentacije, - usluga stručnog nadzora, - trošak geodetskih usluga i elaborata
5.	Društveni dom - rekonstrukcija krovista	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	185.312,50	Grad Šibenik	JAVNI	Odobrene projektne aktivnosti uključuju: pripremne radove i radove rušenja, betonske i AB radove, krovopokrivačke radove, zidarske radove, fasaderske radove, soboslikarsko-ličilačke radove, stolarske radove, sustav zaštite od munje, trošak opremanja Društvenog doma Konjevrate, - trošak projektno-tehničke dokumentacije, - trošak stručnog nadzora gradnje
6.	Opremanje parka u Skradinu dječjim i fitness spravama	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	185.312,50	Grad Skradin	JAVNI	Opremanje parka u Skradinu dječjim i fitness spravama (2 multifunkcionalne sprave za koje je potrebno obaviti zemljane, betonske, zidarske, podopolagačke radove), - trošak projektno-tehničke dokumentacije
7.	Izgradnja dječjeg igrališta Bilice - Novo naselje	1.	TO 3.1.1.	Ugovor sklopljen	161550	Općina Bilice	JAVNI	Zemljani radovi, betonski i arm.betonski radovi, podopolagački radovi i kamenorezački radovi, opremanje igrališta dječjim spravama: ljuljačke za dječju igru njihalice za dječju igru, tobogan,penjalica, drvena klupice bez naslona, drvena klupa s naslonom, samostojeći koš za otpatke, - trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije, - trošak stručnog nadzora

8.	Modernizacija i proširenje gospodarstva	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Unešić	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata Projektne aktivnosti: 1. Kupnja rabljenog traktora 2. kupnja dvobraznog pluga- novo 3. Kupnja prikolice-novo 4. Kupnja svinja za tov- 5 grla 5. Izrada poslovnog plana i podnošenje prijave
9.	Modernizacija i unapređenje gospodarstva	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Promina	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. 1. Stroj za mljevenje masline i hladno prešanje ulja – novo 2. Solarni sustav 3. Kupnja sadnica smilja – 500 komada 4. Trošak izrade poslovnog plana i prijava na natječaj
10.	Razvoj OPG-a Rak	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Šibenik	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata Projektne aktivnosti: 1. Nabavka alata za voćarstvo: motorna pila, motorni trimmer i visokotlačni rezač 2. Nabavka malčera ; nabavka električnih škara s baterijom. 3. Nabavka rabljenog traktora Tomo Vinković 4. Priprema zemljišta za sadnju privođenjem zapuštenog zemljišta svrsi 5. Nabavka farmerskog pletiva i stupova radi ograđivanja

								6.Nabavka sjemena/sadnica aromatičnog i ljekovitog bilja, sadnice maslina i loznih cijepova 7. Poslovni plan trošak konzultanta
11.	Povećanje obima proizvodnje OPG-a	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Unešić	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i/ili proširenje procesa rada i poslovanja Projektne aktivnosti: 1. Kupnja traktorskog atomizera, kapaciteta 100+ litara 2. Solarni el. čuvar, snage 1J+, 12V 3. Kupnja Junica, 7 komada 4. usluge stručnjaka (konzultanta)
12.	Razvoj pčelarstva na OPG-u Gulin Josip	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Šibenik	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja, b)Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata Projektne aktivnosti: 1. Uređenje prostora za vrcanje, skladištenje i punjenje meda (površine cca 20 m2) 2. Kupnja -LR košnica - komplet, 50 kom. 3. Kupnja -Nukleus LR 5 okvira, 20 kom 4. Kupnja -Pčelarska SMS GPRS vaga 3 kom 5. Kupnja -Pčelarska platforma - 3 reda 7/6/7. 3 kom 6. Kupnja -Vrcaljka, samookretna (kazetna), 10 LR okvira 7. Kupnja -Punilica za med 8. Kupnja -Ometač pčela 9. Kupnja -Korito za otklapanje saća (1m) 10. Kupnja -Parni topionik voska tip D 11. Kupnja -Ručna inox preša za vosak tip B
13.	Razvoj OPG-a Banić	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Skradin	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja, b)Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje

							<p>ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proširenje, adaptacija i uređenje skladišta u kući nositelja OPG-a (prema HACCP mjerama i Zakonu o sigurnosti hrane...) Prostor od cca 40 m² 2. SOLARNA ELEKTRANA 2kW 3. Pomoćni objekt za poljoprivrednu opremu 300x260 cm 4. L.R ili Langstrot Rutova košnica- komplet s okvirima - 10 kom 5. Satna osnova- od voska zakošnice 30 kg 6. Hvatač roja preklopni 7. Pčelarska SMS GPRS vaga 8. Pčelarska platforma s čeličnom konstrukcijom za učvršćivanje košnica.2 kompleta 9. Motorna kosa, robustan motorni čistač 1.7 kW s ErgoStart-om € 10. Dekristalizator meda električni, monofazni. 44 11. Solarni topionik za 4 okvira 12. Sušač peludi s 10 ladica 13. Nabavka višegodišnjih sadnica aromatičnog i medonosnog bilja 400 sadnica 14. Izrada mrežne stranice Bee4U/ OPG Banić: Izrada grafičkog dizajna - LOGO web stranice i nabavka apisarij za prezentacije proizvoda. 15. Izrada poslovnog plana 	
14.	Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i opreme	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Skradin	GOSPODARSKI	<p>Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samohodna traktorska kosilica, 2. Režno kućište za traktor kosilicu s bočnim bacanjem 3. Atomizer, kapacitet rezervoara 100 l

								4. Potopna pumpa sa solarnim sustavom i montaža iste 5. Konzultantske usluge
15.	Izgradnja staje, kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, te restrukturiranje vinograda	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odustajanje		Grad Skradin	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i proširenje gospodarstva Projektne aktivnosti: 1. Traktor/motokultivator snage 4ks, novi 2. Agregat za struju 3. Električni tresač maslina 4. Traktorska prskalica (atomizer) 5. Šišač za ovce 6. Podcinčani kolci/stupovi za vinograd – 500kom 7. Podcinčana žica za vinograd – 1000m 8. Izgradnja staje, površine 50m ² 9. Zamjena krovišta na pomoćnoj staji 10. Konzultantske usluge
16.	Modernizacija i proširenje gospodarstva	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili proširenje procesa rada i poslovanja b) Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata Projektne aktivnosti: 1. Kupnja rabljenog traktora 2. Kupnja ovaca-50 grla 3. Kupnja sadnica maslina 150 kom 4. Kupnja solarnog sustava 5. Uređenje zemljišta i priprema za sadnju 6. Trošak izrade poslovnog plana i prijava na natječaj
17.	Modernizacija OPG Đidara	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja Projektne aktivnosti: 1. Kupnja rabljenog traktora 2. Kupnja bočne traktorske kose

								<ul style="list-style-type: none"> 3. Kupnja novog zadnjeg traktorskog utovarivača za stajski gnoj 4. Kupnja novog dvobraznog pluga 5. Kupnja nove muzilice 6. Kupnja el. pastira na solarno napajanje 7. Izrada poslovnog plana
18.	Modernizacija i proširenje gospodarstva	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Ružić	GOSPODARSKI	<p>Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja, b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kupnja rabljenog traktora 2. Kupnja nove kosilice 3. Kupnja nove traktorske freze 4. Kupnja novog atomizera 5. Kupnja koza- 3 grla 6. Izrada poslovnog plana i prijava na natječaj
19.	Za ostanak na selu	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Šibenik	GOSPODARSKI	<p>Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kupnja 2 krave 2. kupnja rabljenog traktora 3. kupnja nove strižne kose 4. Usluge konzultanta
20.	Unapređenje poslovanja do konkurentnijeg poljoprivrednog gospodarstva	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Skradin	GOSPODARSKI	<p>Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ograđivanje nasada – nabava i postavljanje ograde

								<ul style="list-style-type: none"> 2. uređenje poljoprivrednog zemljišta – freziranje terena 3. kupnja poljoprivrednog zemljišta 4. zakup poljoprivrednog zemljišta 5. Nabava nove freze kopačice 6. Nabava nove kosilice 7. Nabava nove pile 8. Nabava novog svrdla za rupe
21.	Povećanje poljoprivredne proizvodnje kroz kupnju životinja i opreme	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	<p>Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kupnja domaćih životinja – 10 krava 2. kupnja kosilice TSK Super 3 1,8 i kretača USP-4R 3. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva
22.	Modernizacija poljoprivredne opreme	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	<p>Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Traktor Solis 26 4WD 2. Malčer FPM LM 110 I SET ASA 85 3. VP Karcher K5 i akumulator 90AH i tresać Alice 2010 4. Izrada poslovnog plana i podnošenje prijave
23.	Rakić jaja	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	<p>Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja, b) Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kokoši (200 kom) – pilenke 2. automatizirana linija ishrane kokošiju pomoću spirale

								<ul style="list-style-type: none"> 3. Centralni element sistema pojenja 4. gnijezda tip-D za kokoši nesilice - (10 kom) 5. sistem za čuvanje i prijenos kukuruza od silosa do mješaone uključujući i usipni koš zapremnine 550 kg 6. sistem za hranjenje 7. sistem za napajanje 8. automatski jajomat 9. konzultantske usluge
24.	Modernizacija i unapređenje proizvodnje vina	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Bilice	GOSPODARSKI	<p>Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. škare za rezidbu 2. preša za grožđe 3. bačva inox
25.	Modernizacija i unapređenje procesa rada OPG-a Radas Ante	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Općina Promina	GOSPODARSKI	<p>Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Traktor - snage od 30 do 40 KS 2. Muljača/runjača - izrađena od inoxa, kapaciteta proizvodnje 2,5-3 t/h 3. Pumpa za mošt - kapaciteta 120 hl/h,
26.	OPG Kević Milovan - razvoj i promicanje konkurentne poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	<p>Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja</p> <p>Projektne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. kupnja - Stihl-Set ASA 85; 2. kupnja - Motorna pila MS 211; 3. kupnja - Akumulatorski specijalni tresać SPA 65; 4. kupnja - Akumulatorska baterija AP 200; 5. kupnja - Standardni punjač AL 101; 6. kupnja - Polovni traktor; 7. kupnja - Malčer SCMA - 100 cm; 8. kupnja - Atomizer nošeni ;

								9. kupnja - Motorna kosa FS 240 10. Strojno usitnjavanje kamena sitnilicom do 10 cm - 10000 m ²
27.	Podizanje trajnih nasada i nabava poljoprivredne mehanizacije	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Skradin	GOSPODARSKI	Ciljevi projekta: a) Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja b) Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata Projektne aktivnosti: 1. Nabava sadnica marelice, 70 kom 2. Nabava rabljenog voćarskog traktora
28.	Modernizacija i unapređenje procesa rada poljoprivrednog gospodarstva Sučić	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Odobren, isplaćena prva rata	111.240,00	Grad Drniš	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja Projektne aktivnosti: 1. Kupnja balirke kockaste (polovna) 2. Kupnja rotirajuće kosilice radnog zahvata od minimalno 205 cm (nova) 3. Kupnja traktorske freze radnog zahvata 185 cm (nova) 4. Kupnja rotacionog sakupljača sijena 5. Kupnja rasipača za umjetni gnoj, kapaciteta min. 800 l (novo) 6. Trošak konzultantske usluge
29.	Ulaganje u opremanje zatvorenog prostora za preradu maslina, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i operativno	2. LAG Natječaj	TO 1.1.1.	Projekt odbijen od APPRRR-a		Općina Promina	GOSPODARSKI	Cilj projekta: Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Projektne aktivnosti: 1. Opremanje zatvorenog prostora za preradu maslina (mini uljare) za potrebe filtriranja/pročišćavanja maslinovog ulja/ 2. Nabava pločastog filtera s pumpom izrađenim za pročišćavanje maslinovog ulja 3. Kupnja traktorskog priključka / razbacivač gnoja i/ili komposta 4. Kupnja atomizera - nošeni do 300 litara

	poslovanje gospodarstva								<p>5. Kupnja traktorskog pluga za oranje u kamenitom tlu</p> <p>6. Kupnja 2 kompleta akumulatorskih škara sa leđnom baterijom za rezidbu maslina</p> <p>7. Kupnja traktorskog priključka drobilica granja</p> <p>8. Stvaranje novog radnog mjesta/trošak doprinosa za 1. novo zaposlenog na puno radno vrijeme</p>
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
